



**REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA**

Vukovarska 148b
HR - 21000 Split • Hrvatska
T: +385(0)21 682 821
F: +385(0)21 490 942



PLAN POSLOVANJA za 2024. godinu

Split, prosinac 2023.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576

info@rcco.hr • www.rcco.hr



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Sadržaj

1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.	3
1.1. Projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji	4
2. Stanje na dan 15. prosinca 2023. godine.....	6
3. Plan poslovnih aktivnosti za 2024. godinu	18
3.1. Osiguranje sredstava i priprema projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta.....	18
3.2. Završetak 1. faze realizacije Projekta	19
3.3. Provedba ugovora o javnoj nabavi.....	20
3.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji CGO i PS	20
3.5. Upravljanje rizicima.....	21
4. Plan zapošljavanja	22
5. Financijski dio.....	22

1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

- REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je županijska komunalna tvrtka za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: RCČO d.o.o.) osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: SDŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u RCČO d.o.o.
- RCČO d.o.o. je upisan u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta MBS: 060207999
- Osobni identifikacijski broj (OIB): 54045399638
- Adresa sjedišta: Vukovarska 148 b, 21000 Split
- Predmet poslovanja: Gospodarenje otpadom na području SDŽ
- Djelatnost u skladu sa nacionalnom klasifikacijom djelatnosti NKD: 3900, Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
- Osoba ovlaštena za zastupanje RCČO d.o.o. je direktor Ivan Vukorepa, struč. spec. oec.
- Organi RCČO d.o.o. su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava RCČO d.o.o.

Sažetak
djelokruga
rada

- RCČO d.o.o. uspostavljen je s ciljem obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije što obuhvaća ulaganje u izgradnju infrastrukture za gospodarenje otpadom - Centra za gospodarenje otpadom (CGO) na lokaciji Kladnjice u Općini Lećevica i šest pretovarnih stanica (PS) na lokacijama u Splitu, Sinju, Zagvozdu, te na otocima Braču, Hvaru i Visu
- Cilj je upravljati izgrađenom infrastrukturom te osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša
- Sukladno zakonskim ovlaštenjima, RCČO d.o.o. se bavi pripremom i provedbom projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno sa šest pretovarnih stanica (Projekt) što obuhvaća pripremu studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih rješenja i dozvola, osiguravanje financijskih sredstava za pripremu i provedbu Projekta, izradu natječajne dokumentacije, provedbu postupaka javne nabave, ugovaranje i izvršavanje sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, te informiranje i edukaciju stanovništva SDŽ o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

Cilj

- Projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji - izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 6 pretovarnih stanica (PS Split, PS Sinj, PS Zagvoz, PS Brač, PS Hvar i PS Vis)

1.1. Projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zakonsku osnovu nalazi u odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023), Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. (NN 84/2023).

Sukladno članku 4. st. 1. toč. 6. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023, Zakon), centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od interesa za RH, prema članku 10. st. 1. Zakona. Sukladno članku 4. st. 1. toč. 16. Zakona, građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada uključujući skladište otpada, pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište, građevina za obradu otpada, uključujući odlagalište otpada, centar za gospodarenje otpadom i reciklažno dvorište za građevni otpad.


Temeljem članka 13. st. 1. Zakona, Centrom za gospodarenje otpadom upravlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Priprema projekta i izgradnja CGO-a implementirana je i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. godine (NN 84/2023, PGO 2023. – 2028.), Mjera 5. **Izgradnja centara za gospodarenje otpadom** u svrhu ostvarenja Cilja br. 1 – Komunalni otpad (za postizanje ciljeva EU-a definiranih u PGO 2023. – 2028.) a kojim je ciljem potrebno povećati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada njegovu uporabu recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu, te smanjiti količinu komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada.

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama u Općini Lećevica jedan je od stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom te uspostave kružnog gospodarstva za područje Splitsko-dalmatinske županije. Kada CGO u SDŽ bude dovršen i započne s radom, u isti će se dovoziti sav miješani komunalni otpad nastao na području Splitsko-dalmatinske županije, ili direktno iz obližnjih jedinica lokalne samouprave ili kamionima u vlasništvu CGO iz šest pretovarnih stanica koje su sastavni dio Projekta. Sav pristigli otpad u CGO-u će se prije odlaganja obraditi, kako bi postao inertan odnosno neopasan za okoliš.

Obzirom da pretovarne stanice služe za dnevno prikupljanje otpada iz obližnjih jedinica lokalne samouprave, u istima će se otpad privremeno skladištiti te pripremati za odvoz u CGO. Miješani komunalni otpad preko nadzemne pretovarne rampe pretovarivat će se u poluprikolicu velike zapremnine u kojoj će se, prije odvoza, sabijati radi smanjenja zapremnine. Glomazni i biorazgradivi otpad strojno će se usitnjavati, zasebno privremeno skladištiti te u konačnici također prevoziti u CGO – prvi na odlaganje, a drugi na kompostiranje. Komunalna vozila će sakupljeni miješani komunalni otpad, glomazni otpad i biorazgradivi otpad dovoziti u najbližu pretovarnu stanicu gdje će biti pretovaren u vozila velikog kapaciteta koja će ga morskim i kopnenim putem prevesti u CGO.

Izgradnjom pretovarnih stanica te prijevozom otpada od njih do budućeg CGO-a, značajno će se smanjiti troškovi odvoza komunalnog otpada, a povećati učinkovitost u sustavu gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Također, izgradnjom pretovarnih stanica stvorit će se preduvjeti za saniranje i zatvaranje odlagališta otpada diljem Splitsko-dalmatinske županije, što će također uvelike pridonijeti održivosti sustava gospodarenja otpadom.

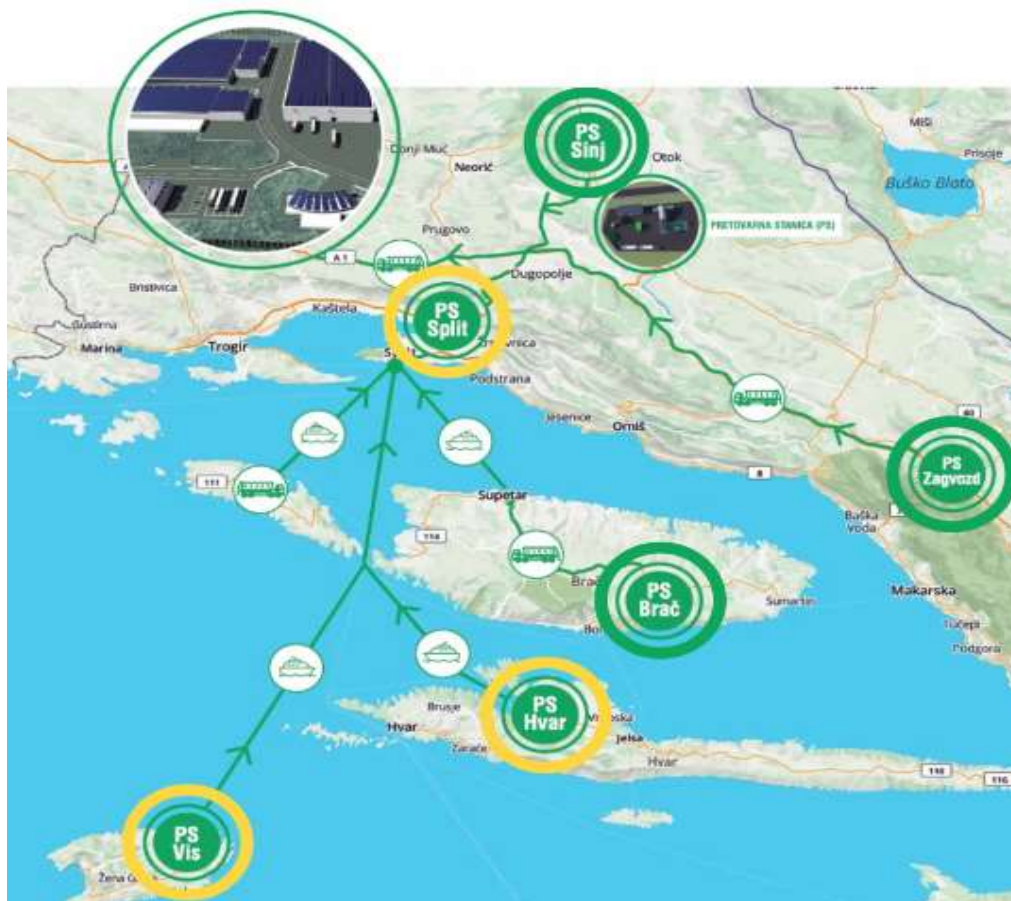

Slika 1: Prikaz lokacija i povezanosti pretovarnih stanica s Centrom za gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj susreću se, naime, s dugotrajnim postupcima javne nabave i ponudama koje su iznad procijenjene vrijednosti zbog iznimnog porasta cijene građevinskih radova i materijala. Iz tog je razloga JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), inicijativa Europske unije koja je pokrenuta s ciljem pružanja potpore novim državama članicama pri razvoju i odobrenju projektnih prijedloga, izdao Smjernice za prilagodbu projekata centara za gospodarenje otpadom i regionalnih sustava gospodarenja otpadom ciljevima kružnog gospodarstva u Hrvatskoj.

Navedenim se dokumentom centrima koji imaju potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz prethodnog financijskog okvira EU, a koja trebaju biti iskorištena do kraja 2023. godine, predlaže faziranje projekata izgradnje na način da se u navedenom vremenskom razdoblju izgrade oni dijelovi centara koji, zbog promjena u EU direktivama, neće moći biti financirani iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU (VFO). Na ovaj će se način iskoristiti postojeća ugovorena sredstva, ali i ostvariti preduvjeti za dodatno financiranje iz novog VFO-a.

Sukladno navedenome, projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji realizirat će se kroz dvije faze.

2. Stanje na dan 15. prosinca 2023. godine

Provedba 1. faze realizacije Projekta - otvorena gradilišta na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom i na lokacijama pretovarnih stanica u Sinju, Zagvozdu i na otoku Braču, financiranje, priprema dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta

Sklapanjem Ugovora o projektiranju i građenju CGO u SDŽ, 1. faza realizacije sa Zajednicom gospodarskih subjekata: SARAĐEN d.o.o., GH HOLDING d.o.o. i VGP DRAVA Ptuj d.o.o. (Ugovor od 19.12.2022. godine), Ugovora o građenju 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozdo s TEHNO-ELEKTRO d.o.o. (ugovori od 12.04.2023. godine), te ugovaranjem Usluga stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ i Usluga stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozdo, uspješno je dovršeno ugovaranje i početak **1. faze realizacije Projekta**.

Trenutno su otvorena ukupno četiri gradilišta u 2023. godini.



Slika 2: Prikaz radova na lokaciji budućeg Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama u Općini Lećevica (prosinac 2023.)

Izgradnja CGO-a planirana je u 14 (četrnaest) Faza tijekom 25 godina na način da redoslijed Faza može biti izmijenjen ukoliko su neovisne jedna o drugoj, te se za svaku Fazu može pojedinačno tražiti Uporabna dozvola u skladu s uvjetima određenim u I. izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole.

Redoslijed izgradnje nije uvjetovan rednim brojem Faze. Uporabne dozvole mogu se izdavati za svaku Fazu pojedinačno u skladu s uvjetima određenim u I. izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole.

Faze izgradnje planirane lokacijskom dozvolom su:

FAZA 1 uključuje izgradnju:

- trafostanice koja se spaja na javnu energetska mrežu.

FAZA 2 uključuje izgradnju:

- unutarnje prometnice uključujući i obodnu prometnicu oko odlagališta (os 5)
- obodnog kanala oko odlagališta
- infrastrukture (vodovod, odvodnja, sabirni spremnici s crpnim stanicama za otpadne, krovne i hidrantske vode, infiltracijski jarci, energetika, telekomunikacije)
- uređenje okoliša (zelene površine)
- ograde s videonadzorom
- vanjske rasvjete
- protupožarnog pojasa unutar CGO-a i
- prostora za obradu građevinskog otpada.

FAZA 3 uključuje izgradnju:

- spremnika za prihvrat otpadnih voda,
- postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i
- spremnika efluenta.

FAZA 4 uključuje izgradnju:

- ulaza
- portirnice
- mosnih vaga
- reciklažnog dvorišta
- upravne zgrade
- parkirališta upravne zgrade
- servisne zgrade s pomoćnim prostorijama za radnike
- parkirališta uz servisnu zgradu
- parkirališta za kamione
- praonice vozila
- uređaja za pranje podvozja
- benzinske postaje.

FAZA 5 uključuje izgradnju:

- postrojenja za mehaničku obradu otpada (sortirnice),
- vrećastog filtera za otprašivanje,
- platoa za diesel agregate i
- skladišta materijala za recikliranje i goriva iz otpada.

FAZA 6 uključuje izgradnju:

- postrojenja za biološku obradu otpada (1. i 2. faza biološke obrade),
- biofiltera,
- vodenog pročišćivača,
- prostora za prihvrat odvojeno sakupljenog biootpada,
- postrojenja za doradu komposta i kompostu sličnog proizvoda i
- skladišta gotovog komposta te parkirališta za kamione.

FAZA 7 uključuje izgradnju:

- platoa za obradu odlagališnog plina,
- postavljanje uređaja za obradu odlagališnog plina i
- izgradnju priključka za plinovode izvedene iz odlagališta neopasnog otpada.

FAZE 8a i 8b

Faza 8a uključuje izgradnju:

- brtvenog i drenažnog sloja kazete 1 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje

Faza 8b uključuje:

- zatvaranje kazete 1 za neopasni otpad i
- povezivanje plinodrenažnog sustava s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 9a, 9b, 9c i 9d

Faza 9a uključuje izgradnju:

- prve polovice površine kazete 6 (površina 6-1) za inertni otpad s izgrađenim temeljnim brtvenim i drenažnim slojem te
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda.

Faza 9b uključuje:

- zatvaranje prve polovice površine kazete 6 za inertni otpad (površina 6-1).

Faza 9c uključuje izgradnju:

- druge polovice površine kazete 6 za inertni otpad (površina 6-2) s izgrađenim temeljnim brtvenim i drenažnim slojem te

- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda.

Faza 9d uključuje:

- zatvaranje druge polovice površine kazete 6 za inertni otpad (površina 6-2).

FAZE 10a i 10b

Faza 10a uključuje:

- izgradnju brtvenog i drenažnog sloja kazete 2 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje.

Faza 10b uključuje:

- zatvaranje kazete 2 za neopasni otpad i
- povezivanje s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 11a i 11b:

Faza 11a uključuje:

- izgradnju brtvenog i drenažnog sloja kazete 3 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje.

Faza 11b uključuje:

- zatvaranje kazete 3 za neopasni otpad i
- povezivanje s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 12a i 12b

Faza 12a uključuje izgradnju:

- brtvenog i drenažnog sloja kazete 4 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje.

Faza 12b uključuje:

- zatvaranje kazete 4 za neopasni otpad i
- povezivanje s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 13a i 13b

Faza 13a uključuje izgradnju:

- brtvenog i drenažnog sloja kazete 5 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje.

Faza 13b uključuje:

- zatvaranje kazete 5 za neopasni otpad i

- povezivanje s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 14a i 14b

Faza 14a uključuje izgradnju:

- krovne fotonaponske elektrane s pripadajućom trafostanicom, svim instalacijama, postavljanje prvog dijela fotonaponskih panela

Faza 14b uključuje:

- proširenje krovne fotonaponske elektrane postavljanjem dodatnih fotonaponskih panela,
- povezivanje s postojećim instalacijama i
- dogradnju trafostanice.

1. faza realizacije CGO obuhvaća projektiranje, odnosno izradu Glavnih projekata i ishođenje Građevinskih dozvola za CGO (osim Faza 10 -13), te izradu Izvedbenih projekata potrebnih za građenje dijela CGO (Faza 1, Faza 2, Faza 4, Faza 8a i Faza 9a, niveliranje terena pogodnim materijalom iz iskopa), kao i građenje dijela CGO (Faza 1, Faza 2, Faza 4, Faza 8a i Faza 9a, te niveliranje terena pogodnim materijalom iz iskopa). U sklopu Faze 2 unutar 1. faze realizacije predviđa se i izvođenje obodne prometnice i obodnog kanala oko odlagališta. Također se u 1. fazi realizacije predviđa krčenje cijele parcele i niveliranje terena cijele parcele materijalom iz iskopa maksimalno na projektiranu kotu posteljice u mjeri u kojoj materijal iz iskopa to omogućava u pogledu kvalitete i količine, dakle niveliraju se i površine koje su predviđene za građenje u 2. fazi realizacije.


Ova faza realizacije Projekta sufinancira se ranije ugovorenim bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz Operativnog programa 2014.-2020.

Ugovoreni iznos 1. faze realizacije CGO u SDŽ je 20.648.632,12 eura bez PDV-a.

Ovoj fazi pripadaju i tri sklopljena ugovora za građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozđ ukupno ugovorenog iznosa od 8.069.102,89 eura bez PDV-a.



Slika 3: Prikaz radova na izgradnji Pretovarne stanice Sinj (prosinac 2023.)

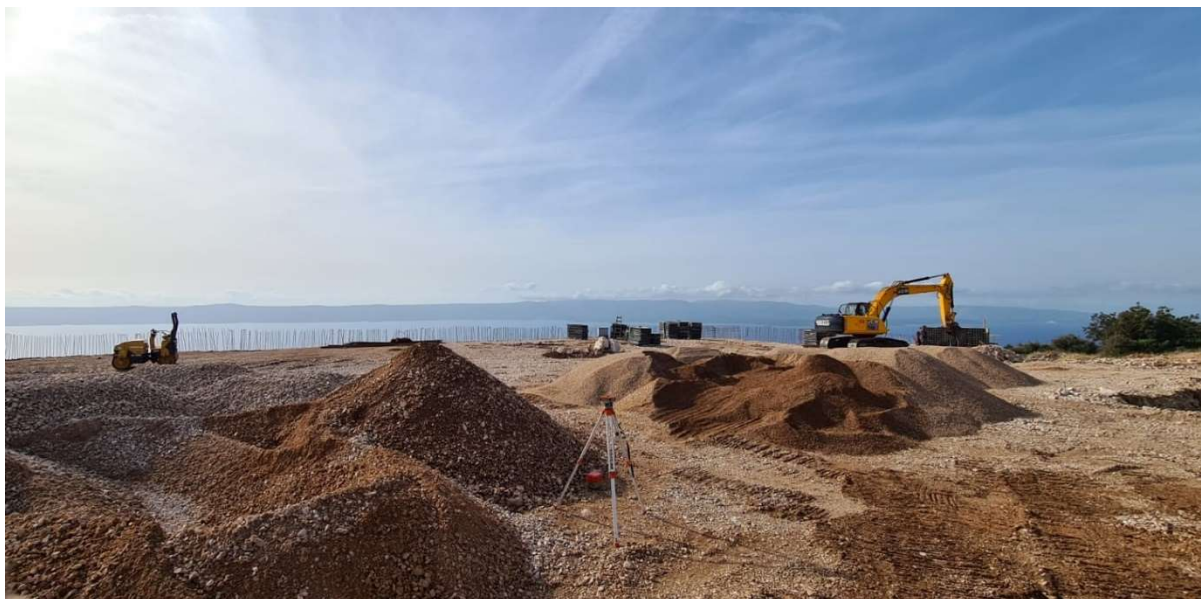

Slika 4: Prikaz radova na izgradnji Pretovarne stanice Brač (prosinac 2023.)



Slika 5: Prikaz radova na izgradnji Pretovarne stanice Zagvozd (prosinac 2023.)

Sredstva za financiranje Projekta u 2023. godini osigurana su iz sljedećih izvora: sredstva Europske unije, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, sredstva Splitsko-dalmatinske županije i kreditna sredstva.

U odnosu na spomenuta kreditna sredstva, u lipnju 2023. godine Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje i davanju jamstva RCČO d.o.o.-u u iznosu od 17.000.000,00 EUR u svrhu izgradnje CGO u SDŽ zajedno s pretovarnim stanicama, te je po prethodno ishođenoj suglasnosti Ministarstva financija na davanje jamstva SDŽ za dugoročni kredit RCČO d.o.o., dana 18.10.2023. godine sklopljen Ugovor o kreditu broj: 5121536894

s Erste&Steiermärkische Bank d.d. i u tijeku je korištenje kredita. Na istoj sjednici Županijska skupština donijela je Odluku o kreditnom zaduženju Splitsko-dalmatinske županije za iznos od 11.000.000,00 EUR radi financiranja Projekta za županijski udio financiranja, a koja je procedura još u tijeku.

2. realizacije Projekta obuhvaća projektiranje i građenje preostalog dijela CGO u SDŽ koji nije obuhvaćen 1. fazom realizacije, kao i preostale 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis, a za što bi se javna nabava provela kad se za to stvore svi potrebni preduvjeti. Ova faza realizacije CGO u SDŽ sufinancirala bi se bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz novog Operativnog programa 2021.-2027. kao i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te sredstvima investicijskog kreditnog zaduženja

U tijeku je priprema projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta obzirom da se planira paralelno odvijanje procedure prijave Projekta za Veliki projekt za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europske unije iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027. i osiguranje preostalog iznosa sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te provedbe postupka Procjene utjecaja zahvata CGO u SDŽ na okoliš i izrade projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta, sve uz praćenje od strane JASPERS-a u svrhu izrade dokumentacije za javnu nabavu i objavu iste.

Rješavanje imovinskopravnih odnosa na lokaciji CGO u SDŽ (Kladnjice, Općina Lećevica), provedba administrativnih i pravnih procedura

Postupak izvlaštenja zemljišta u privatnom vlasništvu

U tijeku su postupci uknjižbe prava vlasništva RCČO d.o.o.-a na onim česticama koje su obuhvaćene pravomoćnim rješenjima o izvlaštenju, a što se tiče nepravomoćnih rješenja, postupci su na rješavanju u žalbenom postupku pred Ministarstvom pravosuđa i uprave od kojih su pojedina odbijena pa se upotrijebila mogućnost pokretanja upravnog spora ulaganjem tužbi pred Upravnim sudom u Splitu. Pojedina su odbijena i od strane Upravnog suda uz mogućnost žalbe na Visoki upravni sud RH.

RCČO d.o.o. sudjeluje u prethodno navedenim postupcima po pozivu u svojstvu zainteresirane osobe odnosno daje odgovore na tužbe i očitovanja.

Zemljište u vlasništvu SDŽ

Temeljem Ugovora o darovanju nekretnina sklopljenog između Splitsko-dalmatinske županije i Općine Lećevica u svrhu izgradnje CGO u SDŽ, 27.12.2023. godine Općinski sud u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću izdao je Rješenje kojim se uknjižuje pravo vlasništva za korist SDŽ na nekretninama Općina Lećevica na kčbr. 2692 i kčbr. 2693.

Izvršavanje sklopljenih ugovora

Tijekom 2023. godine izvršavani su ugovori čija se provedba financira u okviru Projekta i to za:

- ✓ **Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije** (Ugovor od 19.12.2022. godine); odabrani Izvođač Zajednica gospodarskih

subjekata: SARAĐEN d.o.o., Stankovci 82, 23422 Stankovci, GH HOLDING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana i VGP DRAVA Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj s ugovornom cijenom za izvršenje i dovršenje radova od 155.577.118,70 HRK / 20.648.632,12 EUR bez PDV-a odnosno 194.471.398,38 HRK / 25.810.790,15 EUR s PDV-om

- ✓ **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ** (Ugovor od 29.05.2019. godine); odabrani Izvršitelj Zajednica gospodarskih subjekata: EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb; INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb i INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 10.077.050,00 HRK / 1.337.454,38 EUR bez PDV-a odnosno 12.596.312,50 HRK / 1.671.817,97 EUR s PDV-om
- ✓ Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd - **Grupa 1. Građenje Pretovarne stanice Sinj** (Ugovor od 12.04.2023. godine); odabrani Izvođač tvrtka TEHNO-ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca 3, 31 400 Đakovo, s ugovornom cijenom za izvršenje i dovršenje radova od 2.742.044,26 EUR bez PDV-a, Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd - **Grupa 2. Građenje Pretovarne stanice Brač** (Ugovor od 12.04.2023. godine); odabrani Izvođač tvrtka TEHNO-ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca 3, 31 400 Đakovo, s ugovornom cijenom za izvršenje i dovršenje radova od 2.868.744,81 EUR bez PDV-a, Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd - **Grupa 3. Građenje Pretovarne stanice Zagvozd** (Ugovor od 12.04.2023. godine); odabrani Izvođač tvrtka TEHNO-ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca 3, 31 400 Đakovo, s ugovornom cijenom za izvršenje i dovršenje radova od 2.458.313,82 EUR bez PDV-a,
- ✓ **Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd – za Pretovarnu stanicu Sinj** (Ugovor od 31.01.2023. godine); odabrani Izvršitelj INSTITUT IGH, d.d., Ulica Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 26.279,12 EUR bez PDV-a, **Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd – za Pretovarnu stanicu Brač** (Ugovor od 31.01.2023. godine); odabrani Izvršitelj INSTITUT IGH, d.d., Ulica Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 31.189,86 EUR bez PDV-a, **Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd – za Pretovarnu stanicu Zagvozd** (Ugovor od 31.01.2023. godine); odabrani Izvršitelj INSTITUT IGH, d.d., Ulica Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb, s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 28.137,24 EUR bez PDV-a,
- ✓ **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ** (Ugovor od 29.07.2019. godine); odabrani Izvršitelj Zajednica gospodarskih subjekata: MERITUM INŽENJERING d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split; EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, 10 000 Zagreb i IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 3.766.997,60 HRK / 499.966,50 EUR bez PDV-a odnosno 4.708.747,00 HRK / 624.958,13 EUR s PDV-om

- ✓ **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ** (Ugovor od 22.02.2019. godine); odabrani Izvršitelj VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o. (prije: MEDIA VAL d.o.o.), Ulica grada Vukovara 269D, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 1.261.664,04 HRK / 167.451,59 EUR bez PDV-a odnosno 1.577.080,05 HRK / 209.314,49 EUR s PDV-om

te ugovori koji se financira isključivo sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost:

- ✓ **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ** (Ugovor od 04.07.2019. godine); odabrani Izvršitelj GEOPROJEKT, d.d., Sukoišanska 43, 21 000 Split s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 659.874,30 HRK / 87.580,37 EUR bez PDV-a odnosno 824.842,88 HRK / 109.475,46 EUR s PDV-om, te
- ✓ **Usluga izrade revizije Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ** (Ugovor od 09.11.2022. godine); odabrani Izvršitelj EKONERG d.o.o., Koranska ulica 5, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom od 198.000,00 HRK / 26.279,12 EUR bez PDV-a odnosno 247.500,00 HRK / 32.848,90 EUR s PDV-om.

te ugovori koji se financira isključivo sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, a sve u svrhu pripreme i ažuriranja projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta temeljem smjernica JASPERS-a (zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama, engl. Joint Assistance to Support Projects in European Regions):

- ✓ **Usluga izrade novog Idejnog rješenja i Zahtjeva za postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu CGO u SDŽ** (Ugovor od 12.05.2022. godine), Izvršitelj usluge HUDEC PLAN d.o.o., Ulica Vlade Gotovca 4, 10 090 Zagreb na iznos od 69.800,00 HRK bez PDV-a odnosno 87.250,00 HRK s PDV-om
- ✓ **Usluga stručne provjere tehničko tehnološkog koncepta obuhvaćenog u: Studiji izvedivosti, Idejnom rješenju i Studiji utjecaja zahvata na okoliš za CGO u SDŽ** (Ugovor od 03.10.2022. godine), Izvršitelj usluge ReSolution d.o.o., Krč 45, 42 220 Krč na iznos od 198.000,00 HRK bez PDV-a odnosno 247.500,00 HRK s PDV-om
- ✓ **Usluga izrade revizije Studije o utjecaju zahvata CGO u SDŽ na okoliš** (Ugovor od 20.10.2022. godine), Izvršitelj usluge HUDEC PLAN d.o.o., Ulica Vlade Gotovca 4, 10 090 Zagreb na iznos od 189.000,00 HRK bez PDV-a odnosno 236.250,00 HRK s PDV-om
- ✓ **Usluga izrade tehničkog koncepta za postrojenja za obradu otpada unutar CGO u SDŽ sukladno novim zahtjevima JASPERS-a** (Ugovor od 09.11.2022. godine), Izvršitelj usluge IUT Ingenieurgesellschaft Innovative Umwelttechnik GmbH, Hamburgersiedlung 1, A-2824 Seebenstein, na iznos od 189.500,00 HRK bez PDV-a odnosno 236.875,00 HRK s PDV-om

Financiranje troškova Projekta podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava

Sukladno odredbama Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) – (Prilog II Ugovora - Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.), RCČO d.o.o./Korisnik je obavezan tijekom izvršavanja Ugovora podnositi tijelu PT2 sljedeća izvješća: izvješća o napretku, završno izvješće o provedbi Projekta te izvješće nakon provedbe Projekta, te ista dostavljati na obrascu Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Predmetna izvješća se odnose na ugovoreni Projekt u cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadržajno moraju zadovoljavati sve ugovorene uvjete, sukladno članku 14. stavku 14.1. Priloga II Općih uvjeta Ugovora.

Plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava Projekta, RCČO d.o.o./Korisnik potražuje podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava tijelu PT2 kroz sustav eFondovi. Zahtjevi za nadoknadom sredstava moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom o nastalim i potraživanim prihvatljivim troškovima Projekta, a sve sukladno članku 15. stavku 15.6. Priloga II Općih uvjeta Ugovora.

Dijelove neprihvatljivih projektnih troškova snose SDŽ i Fond (u manjem dijelu), obzirom na članak 6. stavak 6.3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) kojim je određeno da je RCČO d.o.o./Korisnik u obvezi osigurati kontinuirano financiranje Projekta te snositi sve Projektne troškove osim prihvatljivih troškova koji su financirani bespovratnim sredstvima.

U skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kapitalne pomoći Fonda koji se sufinanciraju sredstvima OPKK, Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (referentni broj ugovora: JPF.2020.-6.529.) i temeljem realizacije aktivnih ugovora, RCČO d.o.o. je tijekom 2023. godine podnosio Zahtjeve za nadoknadom sredstava s pripadajućim izvješćima o napretku provedbe projekta prema Posredničkom tijelu 2 i Fondu u broju i u visini iznosa u skladu s realizacijom Projekta, te se na opisani način izvršavaju i nadoknade traženih sredstava iz izvora OPKK i Fonda po plaćenim i opravdanim računima za usluge iz Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ, Ugovora o uslugama vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ, Ugovora o uslugama stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ, Ugovora o projektiranju i građenju CGO u SDŽ, 1. faza realizacije, Ugovora o građenju 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd i Ugovora o uslugama stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd.

Infrastrukturni radovi do lokacija CGO i PS

RCČO d.o.o. je kontinuirano pratilo pripremu izrade dokumentacije i ishođenja dozvola u koordinaciji s dionicima projekta (HEP, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Županijska uprava za ceste, Hrvatski Telekom, jedinice lokalne samouprave) za izgradnju infrastrukture do svake od 7 lokacija Projekta.

INFRASTRUKTURA DO LOKACIJE CGO

CESTA	Izgrađen prometni priključak od županijske ceste do lokacije CGO, te je u 2020. godini ishođena Privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju raskrižja nerazvrstane ceste za CGO i županijske ceste Ž6098 Građevinska dozvola za 2. dionicu Ž 6098 i 6115 obuhvaća i elektroenergetski priključak na CGO i priključak vode na CGO – proveden je postupak javne nabave za izbor izvođača radova, u svibnju 2022. godine dostavljen je prijedlog Odluke o odabiru izvođača radova za Rekonstrukciju i djelomično izmještanje cesta Ž 6098 i 6115 – 2. dionica i dio 1. dionice, Odjelu za javnu nabavu u HEP Zagreb na suglasnost. U srpnju 2022. godine donesena je Odluka o odabiru za Izvođača radova te je u rujnu 2022. godine potpisan ugovor s izvođačem radova za izgradnju cijele 2. dionice (obilaznica mjesta Lećevica) i dio 1. dionice gdje će se položiti instalacije za CGO. Radovi na Rekonstrukciji i djelomičnom izmještanju cesta Ž 6098 i 6115 – 2. dionica i dio 1. dionice izvedeni u potpunosti te je u tijeku kompletiranje dokumentacije i priprema za završni obračun i tehnički pregled.
ELEKTROENERGETIKA	Sklopljen Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu Izgradnja Trafostanice Lećevica – radovi su u tijeku i planira se pokusni rad kroz mjesec prosinac 2023. Izvedba elektroenergetskog kabel KB 35 kV Uble do trafostanice u Općini Lećevica - građevinski radovi u tijeku, položen kabel Priključak na telekomunikacijsku mrežu će se izvesti prema suglasnosti nadležnog operatera, osigurano je financiranje izgradnje TK instalacija od Kladnjica do CGO od strane ŽUC-a, dok je RCCO d.o.o. preuzeo izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola
VODOOPSKRBA	Građevinska dozvola za Dionicu 0 – kroz zaseok Taraši i Dionicu IV – kroz zaseok Barani – proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, u srpnju 2020. godine izvođač je uveden u posao. U svibnju 2022. godine, ViK je izvijestio da su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda završeni, a da se tehnički pregled može obaviti po izgradnji cijelog vodoopskrbnog sustava predviđenog u sklopu izgradnje Rekonstrukcije i djelomičnog izmještanja cesta Ž 6098 i 6115 – 1., 2. i 3. dionice Dionica V – Objekti vodoopskrbe za CGO – u svibnju 2022. godine ViK je izvijestio kako se rješavaju imovinskoopravni odnosi, u međuvremenu je istekla lokacijska dozvola predmetnog zahvata te je ViK poduzeo sve radnje u svrhu podnošenja zahtjeva za ishođenje novih posebnih uvjeta, lokacijske i građevinske dozvole. Dana 05.10.2022. godine iz ViK-a su izvijestili kako je preko sustava eDozvola predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Dana 28.11.2022. godine ishođena je Lokacijska dozvola za VS i procrpicu Centar, pristupni put i vodoopskrbni cjevovod. Po pravomoćnosti lokacijske dozvole predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, te je ishođena građevinska dozvola za VS i procrpicu Centar, pristupni put i vodoopskrbni cjevovod s datumom 3.5.2023. godine
INFRASTRUKTURA DO LOKACIJA PS	
PS SPLIT	Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola za cestu Put Kamena s priključkom do PS Split. Po ovjeri svih parcelacijskih elaborata, pokrenut će se postupak otkupa zemljišta i javna nabava za

izgradnju. U studenom 2020. godine potpisan je ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta za cestu Put Kamena. Upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije za imovinsko-pravne poslove je izvršio osiguranje dokaza na nekretninama u zahvatu izgradnje ceste Put Kamena, te je izrađena procjena sudskog vještaka temeljem koje je započelo rješavanje imovinskopravnih odnosa. Ishođena građevinska dozvola za cestu Put Kamena je preduvjet da bi se mogla ishoditi građevinska dozvola za PS Split. Dana 3.5.2023. održan je sastanak u Gradu Splitu na kojem su predstavnici RCČO d.o.o.-a izviješteni o tome da je Grad Split u postupku izmjene i dopune ishođene lokacijske dozvole za cestu Put Kamena kako bi se ubrzalo ishođenje građevinske dozvole i izgradnja prometnog priključka do postojeće prometnice do PS Split. S obzirom na problem imovinsko-pravnih odnosa jer je dio katastarskih čestica unutar obuhvata predviđenog za izgradnju prometnog priključka u privatnom vlasništvu, prijedlog Grada Splita je zasnivanje privremenog prava služnosti preko katastarskih čestica koje su u vlasništvu Grada Splita. Dana 2.6.2023. RCČO d.o.o. je u skladu sa zaključcima sa sastanka održanog u Gradu Splitu dostavio Gradu Splitu, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za imovinsko – pravne odnose Zahtjev za privremeno pravo služnosti za Prometni priključak do Pretovarne stanice Split s Idejnim rješenjem privremenog prometnog priključka.

Dana 7.6.2023. nadležni Upravni odjel odgovorio je mailom da je u svrhu dostavljenog zahtjeva za osnivanjem prava stvarne služnosti potrebno dostaviti Elaborat prava služnosti u kojem će biti označena površina zauzimanja svake nekretnine s opisom služnosti izvršavanje na nekretnini (kojim dijelom nekretnine prema stranama svijeta u kojem pravcu i u kojoj površini), isti je dostavljen nadležnom Upravnom odjelu 21.06.2023. godine. U svrhu rješavanja problematike priključenja PS Split do postojeće prometnice, sukladno Rješenju o osnivanju prava služnosti radi izgradnje PS Split iz srpnja 2023. godine, između Grada Splita i RCČO d.o.o. sklopljen je Ugovor o osnivanju služnosti puta radi izgradnje PS Split.

PS SINJ	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu unutar gospodarske zone Kukuzovac do PS Sinj s potrebnom infrastrukturuom. U prosincu 2020. godine Županijska skupština SDŽ donijela je odluku o sufinanciranju izgradnje prometnice s infrastrukturuom do PS Sinj. U skladu s Proračunom Grada Sinja, trebao bi se pokrenut postupak javne nabave za gradnju. Prema posljednjim informacijama još nije potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Sinjom
PS ZAGVOZD	Ishođena građevinska dozvola za pristupnu cestu od D76 do PS Zagvozd. U rujnu 2020. godine je pokrenut postupak javne nabave za izgradnju pristupne ceste, potpisan je ugovor s Izvođačem radova i sa Stručnim nadzorom. Po rješavanju imovinskopravnih odnosa pristupilo se uvođenju izvođača u posao. U veljači 2022. godine radovi na izgradnji priključka za PS Zagvozd su završeni, te je 06.04.2022. godine izdana Privremena uporabna dozvola za Prometni priključak za PS Zagvozd.
PS VIS	Planiranje i izgradnja infrastrukture do PS može započeti tek nakon što se isходи lokacijska dozvola za odlagalište Wellington.
PS BRAČ, OPĆINA PUČIŠĆA	Ishođena pravomoćna građevinska dozvola pristupne ceste od D113 do PS Brač. Osigurani izvor financiranja. Pristupna cesta je izgrađena, izvršen je tehnički pregled te je izdana privremena uporabna dozvola Izgrađen Priključak na D113. Predan je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za Priključak na D113.
PS STARI GRAD NA HVARU	Ishođeno Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvola za Priključak pretovarne stanice Stari Grad na Hvaru na županijsku cestu ŽC6252. U svibnju 2022. godine naručena je izrada Izmjene i dopune idejnog projekta Prometnog priključka do PS Stari Grad na Hvaru i izrada nove Geodetske podloge za isto.

3. Plan poslovnih aktivnosti za 2024. godinu

Aktivnosti i ciljevi RCČO d.o.o. 2024.-2026.



Slika 6: Simulacija prikaza obuhvata Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Razdoblje sufinanciranja Projekta bespovratnim sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. završava s danom 31.12.2023. godine. Obzirom da je za 2024. godinu planiran završetak građenja 1. faze realizacije Projekta CGO u SDŽ zajedno sa završetkom građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd, slijedi osiguranje svih potrebnih uvjeta za provedbu 2. faze realizacije Projekta. Također, planirana je realizacija sklopljenih ugovora o javnoj nabavi kao i okončanje administrativnih i pravnih procedura.

Planirane aktivnosti za 2024. godinu u nastavku teksta:

3.1. Osiguranje sredstava i priprema projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta

Obzirom na faziranje Projekta iz razloga apsorpcije što više bespovratnih sredstava iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, za projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji potrebno je pripremiti projektno-tehničku dokumentaciju za 2. fazu realizacije Projekta.

Za provedbu 2. faze izrađeno je novo Idejno rješenje za gradnju CGO u SDŽ, izrađena je nova Studija utjecaja na okoliš koja je 30.11.2023. godine predana na postupak procjene utjecaja zahvata CGO u

SDŽ na okoliš u nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te je u tijeku izrada revizije Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi se za Projekt mogla izvršiti projektna prijava na sufinanciranje za Veliki projekt. Studija izvedivosti ključni je dokument kojim će se definirati datumi raspisivanja nabave za 2. fazu realizacije te sami završetak Projekta.

Obzirom na završetak razdoblja sufinanciranja Projekta bespovratnim sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u sljedećem razdoblju planirano je sufinanciranje 2. faze realizacije Projekta bespovratnim sredstvima Europske unije iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027., kao i sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te sredstvima investicijskog kreditnog zaduženja.

Za osiguranje provedbe 2. faze realizacije Projekta planira se paralelno odvijanje procedure prijave Projekta za Veliki projekt za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europske unije iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027. i osiguranje preostalog iznosa sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, provedbe postupka Procjene utjecaja zahvata CGO u SDŽ na okoliš (PUO), te izrada projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta, sve uz praćenje od strane JASPERS-a u svrhu izrade dokumentacije za nabavu i objavu iste. Obzirom na nove Smjernice JASPERS-a za ažuriranje projektna dokumentacije odnosno za uspješnu prijavu za financiranje u novom operativnom programu bilo je potrebno ishoditi potvrdu JASPERS-a tehnološkog procesa unutar MBO. Cilj prilagodbe tehnološkog procesa unutar postrojenja za mehaničko-biološku obradu jest prilagodba novim Direktivama Europske komisije što u praksi znači smanjen utjecaj obrade otpada na okoliš te stavljanje svih procesa unutar postrojenja pod vodene filtere i bio filtere. Cilj europskih direktiva je povećanje postotka izdvojenih reciklata iz miješanog komunalnog otpada, što bi u konačnici znači da je potrebno doseći do 2035. godine 65% odvojenog prikupljenog otpada i 10% stope odlaganja.

2. faza realizacije Projekta obuhvaća Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 2. faza realizacije, Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ, Građenje 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis i Usluge stručnog nadzor građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis, nabavu pokretne opreme za CGO i 6 PS i Usluge tehničke pomoći i upravljanje projektom CGO u SDŽ.

3.2. Završetak 1. faze realizacije Projekta

U 2024. godini očekuje se završetak građenja 1. faze realizacije Projekta CGO u SDŽ zajedno sa završetkom građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd odnosno podnošenje Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava i Završnog izvješća prema PT2, a ograničenja u pogledu zahtjeva trajnosti i osiguravanja revizijskog traga u okviru projekta primjenjuju se pet godina nakon završnog plaćanja.

Obzirom na nove Smjernice JASPERS-a za ažuriranje projektne dokumentacije odnosno za uspješnu prijavu za financiranje u novom operativnom programu potrebno je ishoditi potvrdu JASPERS-a tehnološkog procesa unutar MBO, a što se uskoro očekuje. Cilj prilagodbe tehnološkog procesa unutar postrojenja za mehaničko-biološku obradu jest prilagodba novim Direktivama Europske komisije što u praksi znači smanjen utjecaj obrade otpada na okoliš te stavljanje svih procesa unutar postrojenja pod vodene filtere i bio filtere. Cilj europskih direktiva je povećanje postotka izdvojenih reciklata iz miješanog komunalnog otpada, što bi u konačnici značilo da moramo doseći do 2035. godine 65% odvojenog prikupljenog otpada i 10% stope odlaganja.

3.3. Provedba ugovora o javnoj nabavi

U 2024. godini planirana je provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, i to za:

- Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ
- Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 1. faza realizacije
- Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd
- Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd
- Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ.

Također se planira izrada Dokumentacije o nabavi za sljedeće predmete nabave:

- Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 2. faza realizacije
- Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis
- Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Split, PS Hvar i PS Vis.

3.4. Rješavanje imovinskopravnih odnosa na lokaciji CGO i PS

➤ Lokacija Centra za gospodarenje otpadom - Šilovića Doci, Kladnjice, Općina Lećevica

Po okončanju postupka izvlaštenja zemljišta od privatnih vlasnika odnosno uknjižbom vlasništva zemljišta na RCČO d.o.o., prijenosom vlasništva zemljišta sa SDŽ (darovanog od strane Republike Hrvatske) na RCČO d.o.o. i to nekretnina: zk.č.br. 2710/34, zk.č.br. 2710/36, zk.č.br. 2710/37, zk.č.br. 2692 i zk.č.br. 2693, formirat će se jedinstvena građevinska čestica.

➤ Lokacija pretovarnih stanica PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis

U 2024. godini očekuje se okončanje upravnih postupaka koji nisu u nadležnosti RCČO d.o.o., slijedom čega će se ostvariti uvjeti za ishođenje građevinskih dozvola i sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja. Status pretovarnih stanica PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis je sljedeći:

PS Split

Dana 17.02.2022. godine podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. 13.07.2023. godine Grad Split, Odsjek za izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje, izdao je Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za PS Split uz obrazloženje da ne postoji mogućnost priključenja građevine na prometnu površinu uvažavajući i prijedlog privremenog priključka do PS Split za koje je podnesen Zahtjev za privremeno pravo služnosti. U svrhu rješavanja problematike priključenja PS Split do postojeće prometnice, sukladno Rješenju o osnivanju prava služnosti radi izgradnje PS Split, između Grada Splita i RCČO d.o.o. sklopljen je dana 20.07.2023. godine Ugovor o osnivanju služnosti puta radi izgradnje PS Split. 10.11.2023. godine podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole Upravnom odjelu SDŽ za graditeljstvo i prostorno uređenje i postupak je u tijeku.

PS Stari Grad na Hvaru

Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola s datumom pravomoćnosti 23.06.2021. godine. Glavni projekt je izrađen. Ne može se podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dok Grad Stari Grad ne riješi imovinskopravne odnose iz svoje nadležnosti.

PS Vis

Za PS Vis izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole može započeti kada Grad Vis naruči novi idejni projekt i ishodi lokacijsku dozvolu za Odlagalište Wellington u sklopu kojeg se nalazi PS Vis

3.5. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima redovita je aktivnost RCČO d.o.o.-a čime se omogućuje kontinuirano razmatranje izloženosti Projekta rizicima i postavljanje prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja uspješnosti poslovnih ciljeva.

U sklopu tromjesečnih izvješća Tehničke pomoći/Konzultanata, ažurira se Registar rizika, analiziraju se i specificiraju aktivnosti koje je potrebno realizirati do početka rada CGO u SDŽ, a nisu pod direktnom ingerencijom RCČO d.o.o.

Jedna od aktivnosti RCČO d.o.o. je i praćenje stanja u svezi infrastrukturnih radova do lokacija Centra i šest pretovarnih stanica a koje aktivnosti u najvećem dijelu nisu u nadležnosti RCČO d.o.o. te na njihovu dinamiku ne može utjecati.

RCČO d.o.o. će i u 2024. godini nastaviti s procesom upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i osiguranje financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 2024. godini.

4. Plan zapošljavanja

Obzirom da je RCČO d.o.o. kao krajnji korisnik sredstava EU Fondova isključivo odgovoran za razvoj i implementaciju sustava po fazama (pripremna, provedbena i operativna faza), nužno je da u RCČO d.o.o. budu zaposleni kadrovi određene stručnosti. Plan zapošljavanja u RCČO d.o.o. za 2024. godinu odvijat će se sukladno razvoju Projekta i odredbama Pravilnika o organizaciji RCČO d.o.o. i sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u RCČO d.o.o.

5. Financijski dio

RCČO d.o.o. u provedbenoj fazi projekta (razvoj) nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada RCČO d.o.o. Projekt materijalizira tj. po završetku izgradnje i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije).

Redovno poslovanje RCČO d.o.o. u potpunosti se financira sredstvima osnivača, Splitsko-dalmatinske županije kao jedinog vlasnika, obzirom da još ne ostvaruje vlastite prihode, i to na temelju odluka Županijske skupštine SDŽ odnosno uplatama/transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Osnivač pri tome neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvoja Projekta.

Proračunom Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 155/23 od 27. studenoga 2023) osigurana su sredstva za Projekt za 2024. godinu u iznosu od 1.614.383,33 eura, te su u realizaciji dugoročna kreditna zaduženja za potrebe izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U nastavku dajemo tablični prikaz planiranog kreditnog zaduženja u 2024. godini:

Aktivnost	Planirani iznos kredita (u EUR)	Izvor sredstava	Planirani način financiranja provedbe Projekta
Provedba Projekta (1. i 2. faza realizacije)	11.000.000,00	Komercijalna sredstva banke	Sredstva iz kredita SDŽ
Provedba Projekta (1. i 2. faza realizacije)	17.000.000,00	Komercijalna sredstva banke	Sredstva iz kredita RCČO d.o.o. uz jamstvo SDŽ
UKUPNO	28.000.000,00		

RCČO d.o.o. će ostvarivati priljeve iz EU fondova na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) potpisanog sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, iz FZOEU na temelju Ugovora reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta, iz FZOEU na temelju Ugovora o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za pripremu i provedbu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Lećevica“ za prijavu za sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda i izgradnje pretovarnih stanica davanjem kapitalne pomoći i pripadajućih dodataka te na temelju Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta referentni broj ugovora: JPF.2020.-6.529. potpisanog sa MRRFEU, a sve prema odobrenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava za prihvatljive troškove Projekta u njihovim udjelima prema metodi nadoknade i/ili metodi plaćanja.

U nastavku dajemo tablični prikaz Računskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te plan investicija bez poreza na dodanu vrijednost (*Tablica 2*).

Tablica 2: Plan poslovanja RCČO d.o.o. za 2024. godinu i procjena za 2025. i 2026. godinu s planom investicija

PLAN POSLOVANJA RCČO d.o.o. ZA 2024. GODINU I PROCJENA ZA 2025. I 2026. GODINU SA SUFINANCIRANJEM IZ EU I FZOEU

Računski plan za poduzetnike	EU	Opis	Procijenjena vrijednost	2024			2025			2026		
				SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU
0	EU	Kupnja zemljišta	593.111		125.116	467.995						
	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje 1. faza	20.648.632	2.064.863	3.920.221	14.663.548						
	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje 1. faza ugovorne odredbe	1.937.753	193.775	367.890	1.376.088						
0	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje 2. faza za preraspodjelu	26.126.356				2.612.636	3.185.018	11.913.528		1.775.170	6.640.004
0	EU	CGO - Ugovor o nadzoru radova	1.513.040	151.304	114.651	428.849		172.606	645.630			
0	EU	PS - Ugovor o radovima za 6 PS, građenje 3 PS 1. faza	8.069.103	806.910	1.533.130	5.729.063						
0	EU	PS - Ugovor o nadzoru radova 3PS 1. faza	106.709	10.671	20.259	75.779						
0	EU	CGO - oprema	2.992.793							299.279	568.193	2.125.321

OIB: 54045399638 • MB: 023725576

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA 2024

0	Anex EU	Rezerviranje za nabave veće od procjenjene (po JN) 2. faza Eu projekta, Anex grat agreementa, CGO, PS, Nadzor, oprema itd	63.020.684			3.339.060	6.343.470	23.708.068	2.962.980	5.630.451	21.036.655
010		Tehničko-tehnološka dokumentacija 1. i 2. faze, projekti, elaborati, prevođenje, usluge, dozvole	286.700	238.900		23.900			23.900		
010		Doprinosi za CGO i 6 PS (građevinske dozvole, uporabna dozvola, komunalni i vodni doprinos)	2.269.500	2.269.500							
010		Projektiranje glavnih projekata 6 pretovarnih stanica i projektiranje glavnog projekta za pristupnu prometnicu do PS	39.363	5.300	13.936		20.127				
012		Ulaganje na tuđoj imovini	15.900	5.300		5.300			5.300		
020		Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - troškovi odvjetnika, ugovora/rješenja, upisa čestica, parcelizacija, javnog bilježnika, poreza i svih ostalih neprihvatljivih troškova u procesu izvlaštenja	197.500	197.500							
027		Priključak na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu,	912.000	265.500		646.500					
037		Pokretna oprema PS	5.176.200	2.666.634		2.509.566					
037		Informatička oprema i software	396.100	18.800		86.300			291.000		
037		Uredska oprema i inventar	285.100	15.400		68.500			201.200		
037		Ugradnja piezometara	597.300	464.700		132.600					
037		Oprema za laboratorij i PS, meterološka postaja, solari	451.300			93.000			358.300		

25

OIB: 54045399638 • MB: 023725576

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA 2024

0		Financiranje PDV-a u nabavi i rezerviranje za umanjeno financiranje projekta	3.715.700	1.061.700			1.327.000			1.327.000		
0		Ostale investicije u CGO i PS, Arheološka istraživanja, studija izvedivosti, idejno rješenje puta do piezometra, idejno rješenje Vis,	796.200	265.400			265.400			265.400		
KLASA 0		U K U P N O	140.147.044	10.702.157	6.095.203	22.741.322	11.109.762	9.721.221	36.267.226	5.734.359	7.973.814	29.801.980
4	EU	CGO - TA - Tehnička pomoć	914.802	23.890	45.356	169.655	67.590	128.322	479.989	0		
401		Uredski materijal i materijali za čišćenje	44.600	8.600			9.500			26.500		
406		Usluge operativnih troškova pretovarnih stanica, gorivo i struja u fazi testiranja CGO	523.400	0			0			523.400		
407		Potrošena energija (struja, gorivo...)	158.200	12.300			39.800			106.100		
410		Troškovi usluga telefona, pošte	23.300	4.800			8.000			10.500		
411		Troškovi vanjskih usluga i ostale usluge	27.800	8.000			8.900			10.900		
412		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zaštite na radu i monitoringa	77.500	9.500			19.900			48.100		
413		Registracija vozila i osiguranje	146.600	3.900			5.300			137.400		
414		Zakupnine i najamnine	122.367	40.561			40.785			41.021		
415		Promo materijali i ostali troškovi PR (sajmovi, edukacije, oglasi,)	56.700	9.900			10.100			36.700		
416		Drugi dohodak	18.000	5.600			6.200			6.200		
416		Konzultantske usluge, savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, prevoditelji	192.600	47.900			50.900			93.800		
416		Dokumentacija i troškovi postupka u javnoj nabavi za CGO i PS	39.900	13.300			13.300			13.300		



REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA 2024

417	Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja produkata obrade za vrijeme pokusnog rada	59.700	2.700			2.600			54.400		
419	Ostali nespomenuti rashodi	73.000	9.600			37.600			25.800		
420	Plaće i doprinosi za redovni rad	2.612.100	400.000			509.600			1.702.500		
460	Naknade za službeni put, dnevnice, noćenje, prijevoz, cestarine i sl.	130.000	24.000			53.000			53.000		
461	Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte)	166.800	9.600			13.000			144.200		
461	Ostali rashodi za zaposlene	281.600	28.700			36.600			216.300		
462	Naknade NO	49.800	15.900			16.600			17.300		
463	Reprezentacija	25.900	8.000			8.600			9.300		
464	Osiguranje, zaposlenika, imovine	69.800	3.500			6.600			59.700		
465	Bankarske usluge, tečajne razlike	11.000	3.300			3.700			4.000		
469	Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura	37.500	7.300			8.200			22.000		
KLASA 4	U K U P N O	5.862.969	700.851	45.356	169.655	976.375	128.322	479.989	3.362.421	0	0
	U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4)	146.010.013	11.403.008	6.140.559	22.910.977	12.086.137	9.849.543	36.747.215	9.096.780	7.973.814	29.801.980

KLASA: 11.02.01/001

URBROJ: 01-23-1275

Split, 29. prosinca 2023. godine

