



REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Sjedište: Vukovarska 148b
HR-21000 Split • Hrvatska
T: +385(0)21 682 821
F: +385(0)21 490 942



PLAN POSLOVANJA

za 2025. godinu

Split, prosinac 2024.

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Splitu MBS: 060207999 • Matični broj: 02372576 • OIB: 54045399638
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d IBAN: HR1524020061101184304 • BIC/SWIFT: ESBCHR22
Temeljni kapital 7.244.300,00 euro, uplaćen u cijelosti, Uprava: Ivan Vukorepa, član Uprave
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Sadržaj

1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.	3
1.1. Projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji	4
2. Stanje na dan 15. prosinca 2024. godine	5
3. Plan poslovnih aktivnosti za 2025. godinu.....	14
3.1. Osiguranje sredstava i pripremljenosti projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta	14
3.2. Objava i provedba postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 2. faza realizacije, objava ostalih ugovora o javnoj nabavi	15
3.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji CGO i PS	16
3.4. Upravljanje rizicima	16
4. Plan zapošljavanja.....	16
5. Financijski dio	16

1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

- REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je županijska komunalna tvrtka za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: RCČO d.o.o.) osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću te je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: SDŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% poslovnog udjela u RCČO d.o.o.
- RCČO d.o.o. je upisan u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta MBS: 060207999
- Osobni identifikacijski broj (OIB): 54045399638
- Adresa sjedišta: Vukovarska 148 b, 21000 Split
- Predmet poslovanja: Gospodarenje otpadom na području SDŽ
- Djelatnost u skladu sa nacionalnom klasifikacijom djelatnosti NKD: 3900, Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
- Osoba ovlaštena za zastupanje RCČO d.o.o. je direktor Ivan Vukorepa, struč. spec. oec.
- Organi RCČO d.o.o. su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava RCČO d.o.o.

RCČO d.o.o. je uspostavljen s ciljem obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije što obuhvaća ulaganje u izgradnju infrastrukture za gospodarenje otpadom - Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO u SDŽ) na lokaciji Kladnjice u Općini Lećevica i šest pretovarnih stanica (PS) na lokacijama u Splitu, Sinju, Zagvozdu, te na otocima Braču, Hvaru i Visu. Sukladno zakonskim ovlaštenjima, RCČO d.o.o. se bavi pripremom i provedbom projekta izgradnje CGO u SDŽ zajedno sa šest PS (Projekt) što obuhvaća pripremu studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih rješenja i dozvola, osiguravanje financijskih sredstava za pripremu i provedbu Projekta, izradu natječajne dokumentacije, provedbu postupaka javne nabave, ugovaranje i izvršavanje sklopljenih ugovora o javnoj nabavi te informiranje i edukaciju stanovništva SDŽ o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Vizija

Odgovorno upravljanje izgrađenom strukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguranje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Misija

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva Splitsko-dalmatinske županije te da jamči njegovu održivost. Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravlјati uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.

1.1. Projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zakonsku osnovu nalazi u odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023), Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. (NN 84/2023).

Sukladno članku 4. st. 1. toč. 6. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, 142/2023, Zakon), centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od interesa za RH, prema članku 10. st. 1. Zakona. Sukladno članku 4. st. 1. toč. 16. Zakona, građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada uključujući skladište otpada, pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište, građevina za obradu otpada, uključujući odlagalište otpada, centar za gospodarenje otpadom i reciklažno dvorište za građevni otpad.

Temeljem članka 13. st. 1. Zakona, Centrom za gospodarenje otpadom upravlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Priprema projekta i izgradnja CGO-a implementirana je i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. godine (NN 84/2023, PGO 2023. – 2028.), Mjera 5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom u svrhu ostvarenja Cilja br. 1 – Komunalni otpad (za postizanje ciljeva EU-a definiranih u PGO 2023. – 2028.) a kojim je ciljem potrebno povećati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, njegovu uporabu recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te smanjiti količinu komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada.

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama u Općini Lećevica jedan je od stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom te uspostave kružnog gospodarstva za područje Splitsko-dalmatinske županije. Kada CGO u SDŽ bude dovršen i započne s radom, u isti će se dovoziti sav miješani komunalni otpad koji nastane na području Splitsko-dalmatinske županije, ili direktno iz obližnjih jedinica lokalne samouprave ili kamionima u vlasništvu CGO iz šest pretovarnih stanica koje su sastavni dio Projekta. Sav pristigli otpad u CGO-u će se prije odlaganja obraditi, kako bi postao inertan odnosno neopasan za okoliš.

Obzirom da pretovarne stanice služe za dnevno prikupljanje otpada iz obližnjih jedinica lokalne samouprave, u istima će se otpad privremeno skladištiti te pripremati za odvoz u CGO. Miješani komunalni otpad preko nadzemne pretovarne rampe pretovarivat će se u poluprikolicu velike zapremnine u kojoj će se, prije odvoza, sabijati radi smanjenja zapremnine. Glomazni i biorazgradivi otpad strojno će se usitnjavati, zasebno privremeno skladištiti te u konačnici također prevoziti u CGO – prvi na odlaganje, a drugi na kompostiranje. Komunalna vozila će sakupljeni miješani komunalni otpad, glomazni otpad i biorazgradivi otpad dovoziti u najbližu pretovarnu stanicu gdje će biti pretovaren u vozila velikog kapaciteta koja će ga morskim i kopnenim putem prevesti u CGO.

Izgradnjom pretovarnih stanica te prijevozom otpada od njih do budućeg CGO, značajno će se smanjiti troškovi odvoza komunalnog otpada, a povećati učinkovitost u sustavu gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Također, izgradnjom pretovarnih stanica stvorit će se preduvjeti za saniranje i zatvaranje odlagališta otpada diljem Splitsko-dalmatinske županije, što će također uvelike pridonijeti održivosti sustava gospodarenja otpadom.

2. Stanje na dan 15. prosinca 2024. godine

Provedba 1. faze realizacije Projekta - otvorena gradilišta na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom i na lokacijama pretovarnih stanica u Sinju, Zagvozdu i na otoku Braču, financiranje, priprema dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta

U tijeku su radovi na 1. fazi realizacije projekta što obuhvaća 4 gradilišta – CGO u Kladnjicama u Općini Lećevica, te PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozđ.



Slika 1: Prikaz radova na lokaciji budućeg Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama u Općini Lećevica

Faze izgradnje planirane lokacijskom dozvolom su:

FAZA 1 uključuje izgradnju:

- trafostanice koja se spaja na javnu energetska mrežu.

FAZA 2 uključuje izgradnju:

- unutarnje prometnice uključujući i obodnu prometnicu oko odlagališta (os 5)
- obodnog kanala oko odlagališta
- infrastrukture (vodovod, odvodnja, sabirni spremnici s crpnim stanicama za otpadne, krovne i hidrantske vode, infiltracijski jarci, energetika, telekomunikacije)
- uređenje okoliša (zelene površine)
- ograde s videonadzorom
- vanjske rasvjete
- protupožarnog pojasa unutar CGO-a i
- prostora za obradu građevinskog otpada.

FAZA 3 uključuje izgradnju:

- spremnika za prihvrat otpadnih voda,
- postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i
- spremnika efluenta.

FAZA 4 uključuje izgradnju:

- ulaza
- portirnice
- mosnih vaga
- reciklažnog dvorišta
- upravne zgrade
- parkirališta upravne zgrade
- servisne zgrade s pomoćnim prostorijama za radnike
- parkirališta uz servisnu zgradu
- parkirališta za kamione
- praonice vozila
- uređaja za pranje podvozja
- benzinske postaje.

FAZA 5 uključuje izgradnju:

- postrojenja za mehaničku obradu otpada (sortirnice),
- vrećastog filtera za otprašivanje,
- platoa za diesel agregate i
- skladišta materijala za recikliranje i goriva iz otpada.

FAZA 6 uključuje izgradnju:

- postrojenja za biološku obradu otpada (1. i 2. faza biološke obrade),
- biofiltera,
- vodenog pročišćivača,
- prostora za prihvrat odvojeno sakupljenog biootpada,
- postrojenja za doradu komposta i kompostu sličnog proizvoda i
- skladišta gotovog komposta te parkirališta za kamione.

FAZA 7 uključuje izgradnju:

- platoa za obradu odlagališnog plina,
- postavljanje uređaja za obradu odlagališnog plina i
- izgradnju priključka za plinovode izvedene iz odlagališta neopasnog otpada.

FAZE 8a i 8b

Faza 8a uključuje izgradnju:

- brtvenog i drenažnog sloja kazete 1 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje

Faza 8b uključuje:

- zatvaranje kazete 1 za neopasni otpad i
- povezivanje plinodrenažnog sustava s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 9a, 9b, 9c i 9d

Faza 9a uključuje izgradnju:

- prve polovice površine kazete 6 (površina 6-1) za inertni otpad s izgrađenim temeljnim brtvenim i drenažnim slojem te
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda.

Faza 9b uključuje:

- zatvaranje prve polovice površine kazete 6 za inertni otpad (površina 6-1).

Faza 9c uključuje izgradnju:

- druge polovice površine kazete 6 za inertni otpad (površina 6-2) s izgrađenim temeljnim brtvenim i drenažnim slojem te
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda.

Faza 9d uključuje:

- zatvaranje druge polovice površine kazete 6 za inertni otpad (površina 6-2).

FAZE 10a i 10b

Faza 10a uključuje:

- izgradnju brtvenog i drenažnog sloja kazete 2 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje.

Faza 10b uključuje:

- zatvaranje kazete 2 za neopasni otpad i
- povezivanje s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 11a i 11b:

Faza 11a uključuje:

- izgradnju brtvenog i drenažnog sloja kazete 3 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje.

Faza 11b uključuje:

- zatvaranje kazete 3 za neopasni otpad i
- povezivanje s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 12a i 12b

Faza 12a uključuje izgradnju:

- brtvenog i drenažnog sloja kazete 4 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje.

Faza 12b uključuje:

- zatvaranje kazete 4 za neopasni otpad i
- povezivanje s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 13a i 13b

Faza 13a uključuje izgradnju:

- brtvenog i drenažnog sloja kazete 5 za neopasni otpad,
- povezivanje sa spremnikom za sakupljanje procjednih voda i
- postavljanje zdenaca za otplinjavanje.

Faza 13b uključuje:

- zatvaranje kazete 5 za neopasni otpad i
- povezivanje s uređajem za sakupljanje i obradu odlagališnog plina.

FAZE 14a i 14b

Faza 14a uključuje izgradnju:

- krovne fotonaponske elektrane s pripadajućom trafostanicom, svim instalacijama, postavljanje prvog dijela fotonaponskih panela

Faza 14b uključuje:

- proširenje krovne fotonaponske elektrane postavljanjem dodatnih fotonaponskih panela,
- povezivanje s postojećim instalacijama i
- dogradnju trafostanice.



Slika 2: Prikaz radova na izgradnji Pretovarne stanice Brač



Slika 3: Prikaz radova na izgradnji Pretovarne stanice Sinj



Slika 4: Prikaz radova na izgradnji Pretovarne stanice Zagvozd

Obzirom na završetak razdoblja sufinanciranja Projekta, 1. faze realizacije bespovratnim sredstvima Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) s 31.12.2023. godine, to je sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i temeljem realizacije aktivnih ugovora, dana 31.01.2024. godine podnesen Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i Završno izvješće prema Posredničkom tijelu 2 i Fondu te su izvršene nadoknade traženih sredstava iz izvora OPKK i Fonda po plaćenim i opravdanim računima za ugovorene radove i usluge.

Nastavno na Odluku Vlade RH o koordinaciji aktivnosti vezanih uz izgradnju četiri centra za gospodarenje otpadom od 04.04.2024. godine u cilju izvršenja obveza iz Plana gospodarenja otpadom RH 2023.-2028. (KLASA: 022-03/24-04/164, URBROJ: 50301-05/27-24-1), dana 09.07.2024. godine sklopljen je Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i RCČO d.o.o. kao Korisnika sredstava, odnosno izgradnja i nabava opreme za CGO-e privremeno se nastavila financirati u 2024. godini prema postojećim omjerima sufinanciranja iz sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru OPKK (90% sredstava EU fondovi i FZOEU, 10% sredstava JLP(R)S) i to sve do sklapanja novih ugovora u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. te u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za dijelove investicije kao što su pretovarne stanice.

Temeljem prethodno navedenog Ugovora o privremenom sufinanciranju projekta CGO u SDŽ sklopljenog između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i RCČO d.o.o./Korisnika sredstava i Ugovora o privremenom sufinanciranju projekta „Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije“, davanjem sredstava kapitalne pomoći sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i RCČO d.o.o./Korisnika sredstava (Registarski broj 2024/023897, od 23.07.2024. godine) te Dodatka broj 2024/033533 Ugovora o privremenom sufinanciranju projekta „Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije“, davanjem sredstava kapitalne pomoći (od 27.11.2024. godine), u 2024. godini osiguralo se financiranje za izgradnju CGO do sklapanja PKK Ugovora kao i za izgradnju pretovarnih stanica do sklapanja NPOO Ugovora i to prema postojećim omjerima sufinanciranja iz sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru OPKK 2014.-2020. (90% sredstava EU fondovi i FZOEU, 10% sredstava JLP(R)S), te je RCČO d.o.o. kao Korisnik sredstava podnosilo pripadajuće Zahtjeve za privremenim financiranjem (ZNS).

Nadalje, temeljem sklopljenog Ugovora o privremenom sufinanciranju projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 09.07.2024. godine, u tijeku je priprema projektne prijave za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd radi nastavka sufinanciranja u okviru programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Također, dana 12.12.2024. godine donesena je Odluka Vlade RH o nastavku financiranja projekata izgradnje četiri centra za gospodarenje otpadom odobrenih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna u razdoblju od 2025. do 2028. godine za sklapanje ugovora o sufinanciranju i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., a kojom su izmijenjeni omjeri sufinanciranja projekata.

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta

Revidirana Studija izvedivosti s CBA analizom i Aplikacijski obrazac predani su JASPERS-u i u Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije temeljem čega je 01.07.2024. godine ishođen JASPERS Action Completion Note i izvršena projektna prijava, a koji postupak je u tijeku, a sve u cilju osiguranja sredstava financiranja 2. faze realizacije projekta u okviru novog PKK 2021.-2027.

Za osiguranje provedbe 2. faze realizacije Projekta, u tijeku je i provedba postupka Procjene utjecaja zahvata CGO u SDŽ na okoliš (PUO) a koji je postupak započet 30.11.2023. godine predajom Studije utjecaja zahvata CGO u SDŽ na okoliš na predmetni postupak u Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Provedba sklopljenih ugovora za:

- Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ
- Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 1. faza realizacije
- Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd
- Građenje 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd
- Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ

Provjere/kontrole na licu mjesta

Dana 01.03.2024. godine izvršena je od strane predstavnika PT2 Provjera na licu mjesta (PLM br. 3) i to u službenim prostorijama RCČO d.o.o. te na gradilištu pretovarne stanice PS Sinj i gradilištu CGO u Lećevici. Predmetom Provjere bio je status projektiranja i izvođenja radova na Projektu u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, financijska dokumentacija i računovodstveni sustav za Projekt vezano za programsko razdoblje OPKK 2014.-2020., te mjere promidžbe i vidljivosti. Zaprmljenim Izvještajem o provjeri na licu mjesta od 26.03.2024. godine utvrđeno je kako tijekom PLM-a nisu utvrđeni nedostaci te nema preporuka.

Također, dana 27.11.2024. izvršena je od strane predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kontrola na licu mjesta i to ugovorne dokumentacije, zahtjeva za isplatom sredstava Fonda s pripadajućom dokumentacijom, te drugih knjigovodstvenih dokaza namjenskog korištenja sredstava Fonda, te je izvršen i obilazak gradilišta CGO. Najavljena je još jedna provjera na licu mjesta i obilazak gradilišta CGO od strane Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kako bi se provjerilo izvršavaju li se ugovorne obveze u skladu sa sklopljenim Ugovorom o privremenom sufinanciranju projekta CGO u SDŽ.

Infrastrukturni radovi do lokacija CGO i PS

RCČO d.o.o. redovito prati pripremu izrade dokumentacije i ishođenja dozvola u koordinaciji s dionicima Projekta za izgradnju infrastrukture do svake od 7 lokacija Projekta.

INFRASTRUKTURA DO LOKACIJE CGO

CESTA

Izgrađen prometni priključak od županijske ceste do lokacije CGO, te je u 2020. godini ishođena Privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju raskrižja nerazvrstane ceste za CGO i županijske ceste Ž6098

Radovi na Rekonstrukciji i djelomičnom izmještanju cesta Ž 6098 i 6115 – 2. dionica i dio 1. dionice u sklopu koje se nalaze elektroenergetske, vodovodne i TK instalacije, izvedeni su u potpunosti, izvršen je završni obračun i zakazan tehnički pregled za 19.12.2024. te se očekuju privremene uporabne dozvole. Za


	Rekonstrukciju i djelomično izmještanje cesta Ž 6098 i 6115 – 3. dionica izrađen je DON, te se uskoro očekuje objava prethodnog savjetovanja
ELEKTROENERGETIKA	Sklopljen Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu Izgradnja Trafostanice Lečevica – po izvršenju internog tehničkog pregleda ista je puštena u pokusni rad Izvedba elektroenergetskog kabela KB 35 i 20 kV Uble do trafostanice u Općini Lečevica - priključni KB 35 kV za TS Lečevica pušten pod napon. U srpnju 2024. RCČO dostavio HEP-u Zahtjev za izdavanje Elektroenergetske suglasnosti za CGO u SDŽ zbog povećanja potrebne snage s 2,4 MW na 6,0 MW Priključak na telekomunikacijsku mrežu će se izvesti prema suglasnosti nadležnog operatera, osigurano je financiranje izgradnje TK instalacija od Kladnjica do CGO od strane ŽUC-a, dok je RCČO d.o.o. preuzeo izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola
VODOOPSKRBA	Građevinska dozvola za Dionicu 0 – kroz zaseok Taraši i Dionicu IV – kroz zaseok Barani – proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, u srpnju 2020. godine izvođač je uveden u posao. U svibnju 2022. godine, ViK je izvijestio da su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda završeni, a da se tehnički pregled može obaviti po izgradnji cijelog vodoopskrbnog sustava predviđenog u sklopu izgradnje Rekonstrukcije i djelomičnog izmještanja cesta Ž 6098 i 6115 – 1., 2. i 3. dionice Dionica V – Objekti vodoopskrbe za CGO – u svibnju 2022. godine ViK je izvijestio kako se rješavaju imovinskopравни odnosi, u međuvremenu je istekla lokacijska dozvola predmetnog zahvata te je ViK poduzeo sve radnje u svrhu podnošenja zahtjeva za ishođenje novih posebnih uvjeta, lokacijske i građevinske dozvole. Dana 05.10.2022. godine iz ViK-a su izvijestili kako je preko sustava eDozvola predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Dana 28.11.2022. godine ishođena je Lokacijska dozvola za VS i procrpnicu Centar, pristupni put i vodoopskrbni cjevovod. Po pravomoćnosti lokacijske dozvole predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, te je ishođena građevinska dozvola za VS i procrpnicu Centar, pristupni put i vodoopskrbni cjevovod s datumom 3.5.2023. godine. Dana 17.12.2024. godine iz ViK-a su izvijestili da je za VS i procrpnicu Centar, pristupni put i vodoopskrbni cjevovod pokrenut postupak javne nabave za izgradnju VS Centar sa pratećim objektima i da je u tijeku postupak prethodnog savjetovanja
INFRASTRUKTURA DO LOKACIJA PS	
PS SPLIT	Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola za cestu Put Kamena s priključkom do PS Split. Po ovjeri svih parcelacijskih elaborata, pokrenut će se postupak otkupa zemljišta i javna nabava za izgradnju. U studenom 2020. godine potpisan je ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta za cestu Put Kamena. Upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije za imovinsko-pravne poslove je izvršio osiguranje dokaza na nekretninama u zahvatu izgradnje ceste Put Kamena, te je izrađena procjena sudskog vještaka temeljem koje je započelo rješavanje imovinskopравниh odnosa. Ishođena građevinska dozvola za cestu Put Kamena je preduvjet da bi se mogla ishoditi građevinska dozvola za PS Split. Dana 3.5.2023. održan je sastanak u Gradu Splitu na kojem su predstavnici RCČO d.o.o.-a izvijestili o tome da je Grad Split u postupku izmjene i dopune ishođene lokacijske dozvole za cestu Put Kamena kako bi se ubrzalo ishođenje građevinske dozvole i izgradnja prometnog priključka do postojeće prometnice do PS Split. S obzirom na problem imovinsko-pravnih odnosa jer je dio katastarskih čestica unutar obuhvata predviđenog za izgradnju prometnog priključka u privatnom vlasništvu, prijedlog Grada Splita je zasnivanje privremenog prava služnosti preko katastarskih čestica koje su u vlasništvu Grada Splita. Dana 2.6.2023. RCČO d.o.o. je

u skladu sa zaključcima sa sastanka održanog u Gradu Splitu dostavio Gradu Splitu, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za imovinsko – pravne odnose Zahtjev za privremeno pravo služnosti za Prometni priključak do Pretovarne stanice Split s Idejnim rješenjem privremenog prometnog priključka.

Dana 7.6.2023. nadležni Upravni odjel odgovorio je mailom da je u svrhu dostavljenog zahtjeva za osnivanjem prava stvarne služnosti potrebno dostaviti Elaborat prava služnosti u kojem će biti označena površina zauzimanja svake nekretnine s opisom služnosti izvršavanje na nekretnini (kojim dijelom nekretnine prema stranama svijeta u kojem pravcu i u kojoj površini), isti je dostavljen nadležnom Upravnom odjelu 21.06.2023. godine. U svrhu rješavanja problematike priključenja PS Split do postojeće prometnice, sukladno Rješenju o osnivanju prava služnosti radi izgradnje PS Split iz srpnja 2023. godine, između Grada Splita i RCČO d.o.o. sklopljen je Ugovor o osnivanju služnosti puta radi izgradnje PS Split od 20.7.2023. U tijeku je postupak uknjižbe prava služnosti puta na teret 10 čestica koje su u vlasništvu Grada Splita.

PS SINJ	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu unutar gospodarske zone Kukuzovac do PS Sinj s potrebnom infrastrukturom. U prosincu 2020. godine Županijska skupština SDŽ donijela je odluku o sufinanciranju izgradnje prometnice s infrastrukturom do PS Sinj. U skladu s Proračunom Grada Sinja, trebao bi se pokrenut postupak javne nabave za gradnju. Prema posljednjim informacijama još nije potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Sinjom
PS ZAGVOZD	Ishođena građevinska dozvola za pristupnu cestu od D76 do PS Zagvozd. U rujnu 2020. godine je pokrenut postupak javne nabave za izgradnju pristupne ceste, potpisan je ugovor s Izvođačem radova i sa Stručnim nadzorom. Po rješavanju imovinskopravnih odnosa pristupilo se uvođenju izvođača u posao. U veljači 2022. godine radovi na izgradnji priključka za PS Zagvozd su završeni, te je 06.04.2022. godine izdana Privremena uporabna dozvola za Prometni priključak za PS Zagvozd
PS VIS	Planiranje i izgradnja infrastrukture (energetika, vodoopskrba, TK instalacije) do PS može započeti tek nakon što se ishodi lokacijska dozvola za odlagalište Wellington
PS BRAČ, OPĆINA PUČIŠĆA	Izgrađen Priključak od D113 do PS Brač
PS STARI GRAD NA HVARU	Ishođeno Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvola za Priključak pretovarne stanice Stari Grad na Hvaru na županijsku cestu ŽC6252. U svibnju 2022. godine naručena je izrada Izmjene i dopune idejnog projekta Prometnog priključka do PS Stari Grad na Hvaru i izrada nove Geodetske podloge za isto.

3. Plan poslovnih aktivnosti za 2025. godinu

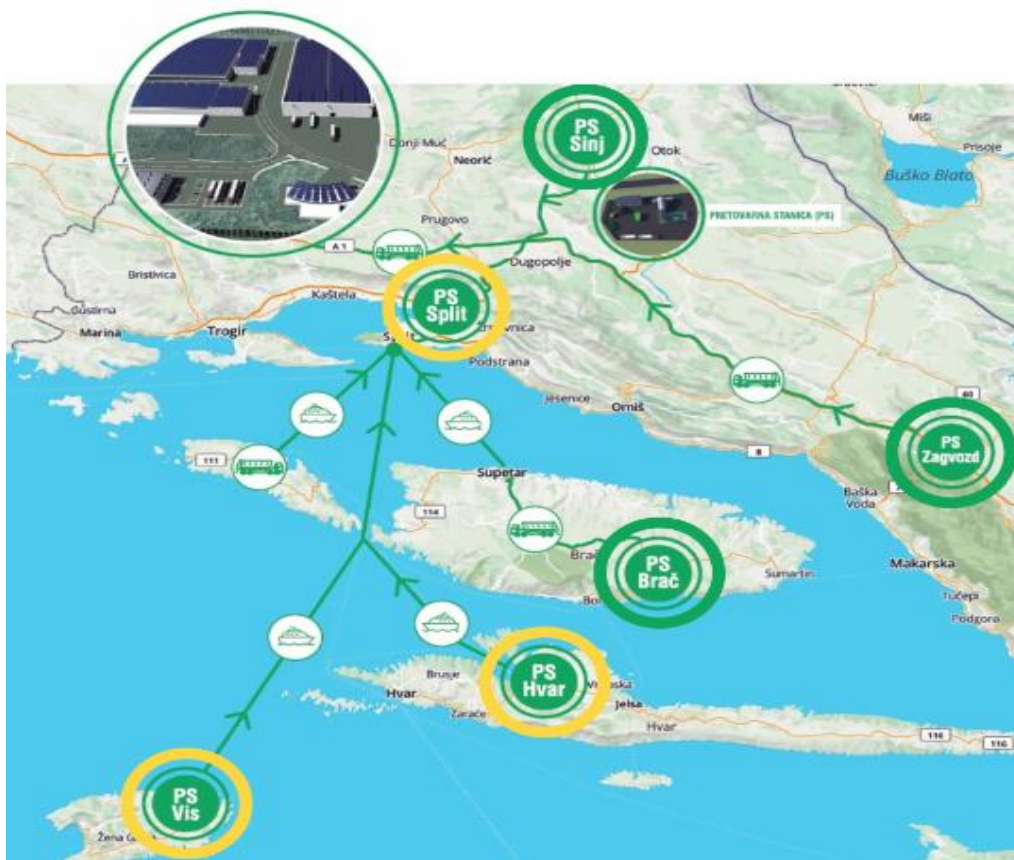

Slika 5: Prikaz lokacija i povezanosti pretovarnih stanica s Centrom za gospodarenje otpadom

Planirane aktivnosti za 2025. godinu su sljedeće:

3.1. Osiguranje sredstava i pripremljenosti projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta

U 2025. godini planirano je sufinanciranje 2. faze realizacije Projekta bespovratnim sredstvima Europske unije iz novog Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., kao i sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Splitsko-dalmatinske županije te sredstvima investicijskog kreditnog zaduženja.

U tijeku je priprema projektno-tehničke dokumentacije za 2. fazu realizacije Projekta, te se u 2025. godini očekuje završetak potrebnih zakonskih procedura, postupaka i prijava za odobrenje Projekta za sufinanciranje bespovratnim sredstvima.

Po predaji Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji dana 1.7.2024. godine ishođen je JASPERS Action Completion Note uz dva uvjeta za odobrenje major projekta: jedan uvjet je završen postupak Procjene utjecaja zahvata CGO u SDŽ na okoliš (PUO) ishodom pozitivnog Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, a drugi uvjet je bio da sve lokacije CGO i PS budu u skladu s Natura 2000 tj. EU Direktivama o novim ciljevima očuvanja okoliša što je i izvršeno,

tako da preostaje završiti PUO postupak. Temeljem ishodenog JASPERS Action Completion Note-a izvršena je projektna prijava, a koji postupak je u tijeku.

Postupak Procjene utjecaja zahvata CGO u SDŽ na okoliš (PUO) pri nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije započet je dana 30.11.2023. godine predajom Studije o utjecaju zahvata CGO u SDŽ na okoliš na predmetni postupak. Informacija o istome objavljena je na web stranicama Ministarstva 14.05.2024. godine. Dana 20.08.2024. godine održana je 1. sjednica Povjerenstva za PUO na lokaciji CGO u Lećevici a kojeg čine stručnjaci koji utvrđuju cjelovitost i stručnu utemeljenost Studije. Postupak je u tijeku, slijedi upućivanje Studije na javnu raspravu koja ne može biti kraća od 30 dana i na kojoj će moći sudjelovati javnost i zainteresirana javnost te za vrijeme koje će se održati javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Završetak postupka očekuje se u prvom kvartalu 2025. godine.

Po završenom postupku PUO, steći će se uvjeti za osiguranje sufinanciranja Projekta bespovratnim sredstvima u okviru operativnog Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

3.2. [Objava i provedba postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 2. faza realizacije, objava ostalih ugovora o javnoj nabavi](#)

2. faza realizacije Projekta obuhvaća projektiranje i građenje preostalog dijela CGO u SDŽ koji nije obuhvaćen 1. fazom realizacije, kao i preostale 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis, a za što bi se javna nabava provela kad se za to stvore svi potrebni preduvjeti. Planirano je da se ova faza realizacije projekta CGO u SDŽ sufinancira bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz novog operativnog Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. kao i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Splitsko-dalmatinske županije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te sredstvima investicijskog kreditnog zaduženja.

2. faza realizacije Projekta obuhvaća projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 2. faza realizacije, stručni nadzor građenja CGO u SDŽ, građenje preostale 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis i stručni nadzor građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis, nabavu pokretne opreme za CGO i 6 PS, Tehničku pomoć.

U 2025. godini planira se objava javnih natječaja za sljedeće predmete nabave:

- Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 2. faza realizacije
- Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis
- Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis te
- Usluge Tehničke pomoći.

3.3. Rješavanje imovinskopravnih odnosa na lokaciji CGO i PS

Lokacija Centra za gospodarenje otpadom - Šilovića Doci, Kladnjice, Općina Lećevica

Po okončanju postupka izvlaštenja zemljišta od privatnih vlasnika odnosno uknjižbom vlasništva zemljišta na RCČO d.o.o., prijenosom vlasništva zemljišta sa SDŽ (darovanog od strane Republike Hrvatske) na RCČO d.o.o. i to nekretnina: zk.č.br. 2710/34, zk.č.br. 2710/36, zk.č.br. 2710/37, zk.č.br. 2692 i zk.č.br. 2693, formirat će se jedinstvena građevinska čestica.

Lokacija pretovarnih stanica PS Split, PS Stari Grad na Hvaru i PS Vis

U 2025. godini očekuje se okončanje upravnih postupaka koji nisu u nadležnosti RCČO d.o.o., slijedom čega će se ostvariti uvjeti za ishodenje građevinskih dozvola i sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja.

3.4. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima redovita je aktivnost RCČO d.o.o.-a čime se omogućuje kontinuirano razmatranje izloženosti Projekta rizicima i postavljanje prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja uspješnosti poslovnih ciljeva.

Jedna od aktivnosti RCČO d.o.o. je i praćenje stanja u svezi infrastrukturnih radova do lokacija Centra i šest pretovarnih stanica a koje aktivnosti u najvećem dijelu nisu u nadležnosti RCČO d.o.o. te na njihovu dinamiku ne može utjecati.

RCČO d.o.o. će i u 2025. godini nastaviti s procesom upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i osiguranje financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 2025. godini.

4. Plan zapošljavanja

Obzirom da je RCČO d.o.o. kao krajnji korisnik sredstava EU Fondova isključivo odgovoran za razvoj i implementaciju sustava po fazama (pripremna, provedbena i operativna faza), nužno je da u RCČO d.o.o. budu zaposleni kadrovi određene stručnosti. Plan zapošljavanja u RCČO d.o.o. za 2025. godinu odvijat će se sukladno razvoju Projekta i odredbama Pravilnika o organizaciji RCČO d.o.o. i sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u RCČO d.o.o.

5. Financijski dio

RCČO d.o.o. u provedbenoj fazi projekta (razvoj) nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada RCČO d.o.o. Projekt materijalizira tj. po završetku izgradnje i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije).

Redovno poslovanje RCČO d.o.o. u potpunosti se financira sredstvima osnivača, Splitsko-dalmatinske županije kao jedinog vlasnika, obzirom da još ne ostvaruje vlastite prihode, i to na temelju odluka Županijske

skupštine SDŽ odnosno uplatama/transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Osnivač pri tome neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvoja Projekta.

Proračunom Splitsko-dalmatinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije, broj 175/2024 od 9. prosinca 2024. godine) osigurana su sredstva za Projekt za 2025. godinu u iznosu od 1.001.128,57 eura, te su u realizaciji dugoročna kreditna zaduženja za potrebe izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U nastavku dajemo tablični prikaz realiziranog i planiranog kreditnog zaduženja u 2025. godini:

Aktivnost	Planirani iznos kredita (u EUR)	Izvor sredstava	Planirani način financiranja provedbe Projekta
Provedba Projekta (1. i 2. faza realizacije)	11.000.000,00	Komercijalna sredstva banke	Sredstva iz kredita SDŽ
Aktivnost	Iznos ugovorenog kredita	Izvor sredstava	Planirani način financiranja provedbe Projekta
Provedba Projekta (1. i 2. faza realizacije)	17.000.000,00	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	Sredstva iz kredita RCČO d.o.o. uz jamstvo SDŽ
UKUPNO	28.000.000,00		

Otplata kredita je u 30 (trideset) jednakih polugodišnjih rata. Prva rata dospijeva na dan 01.01.2026. godine, a zadnja rata na dan 01.07.2040. godine. Iznos rate je 566.666,67 EUR.

Planirani iznos za otplatu glavnice u 2026. godini je 1.133.334 EUR, te je isti taj iznos planiran za otplatu glavnice i u 2027. godini.

RCČO d.o.o. će ostvarivati priljeve iz EU fondova na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) potpisanog sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, iz FZOEU na temelju Ugovora reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta, iz FZOEU na temelju Ugovora o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za pripremu i provedbu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Lečevica“ za prijavu za sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda i izgradnje pretovarnih stanica davanjem kapitalne pomoći i pripadajućih dodataka te na temelju Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta referentni broj ugovora: JPF.2020.-6.529. potpisanog sa MRRFEU, a sve prema odobrenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava za prihvatljive troškove Projekta u njihovim udjelima prema metodi nadoknade i/ili metodi plaćanja.

U nastavku dajemo tablični prikaz Računskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu te plan investicija bez poreza na dodanu vrijednost (Tablica 2).

Tablica 2: Plan poslovanja RCČO d.o.o. za 2025. godinu i procjena za 2026. i 2027. godinu s planom investicija

PLAN POSLOVANJA RCČO d.o.o. ZA 2025. GODINU I PROCJENA ZA 2026. I 2027. GODINU SA SUFINANCIRANJEM IZ EU I FZOEU

Računski plan za poduzetnike	EU	Opis	Procijenjena vrijednost	2025			2026			2027		
				SDŽ	Fond	EU/ Državni proračun	SDŽ	Fond	EU/ Državni proračun	SDŽ	Fond	EU/ Državni proračun
0	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje 1. Faza	1.173.069	175.960	410.574	586.535						
0	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje 2. faza	70.191.878	3.743.437	8.734.688	12.478.125	6.785.344	15.832.470	22.617.814			
0	EU	CGO - Ugovor o nadzoru radova – 2 faza	598.848	44.914	104.798	149.712	44.914	104.798	149.712			
0	EU	PS - Ugovor o radovima za 6 PS, građenje 3 PS 1. faza	5.306.839	796.026	1.857.394	2.653.419						
0	EU	PS - Ugovor o radovima za 6 PS, građenje 6 PS 2. faza	12.722.350	496.485	1.158.465	1.654.950	1.411.868	3.294.357	4.706.225			
0	EU	PS - Ugovor o nadzoru radova 3PS 1. faza	12.840	1.926	4.494	6.420						
0	EU	PS - Ugovor o nadzoru radova PS, 2. faza	175.682	13.176	30.744	43.921	13.176	30.744	43.921			
0	EU	CGO - oprema	6.550.000							982.500	2.292.500	3.275.000
010		Tehničko-tehnološka dokumentacija 1. i 2. faze, projekti, elaborati, prevođenje, usluge, dozvole	286.700	238.900			23.900			23.900		
010		Doprinosi za CGO i 6 PS (građevinske dozvole, uporabna dozvola, komunalni i vodni doprinos)	2.269.500				2.269.500					

010		Projektiranje glavnih projekata 6 pretovarnih stanica i projektiranje glavnog projekta za pristupnu prometnicu do PS	120.000	120.000								
012		Ulaganje na tuđoj imovini Lečevica	15.900	5.300			5.300			5.300		
020		Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - troškovi odvjetnika, ugovora/rješenja, upisa čestica, parcelizacija, javnog bilježnika, poreza i svih ostalih neprihvatljivih troškova u procesu izvlaštenja	197.500	197.500								
027		Priključak na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu	912.000	265.500			646.500					
037	EU	Pokretna oprema PS	5.196.525							779.479	1.818.784	2.598.262
037	EU	Informatička oprema i software	300.000	20.000			80.000			30.000	70.000	100.000
037	EU	Uredska oprema i inventar	286.200	20.000			20.000			36.930	86.170	123.100
037		Ugradnja piezometara	597.300				597.300					
037	EU	Oprema za laboratorij i PS, meterološka postaja, solari	489.620				19.698	45.962	65.660	358.300		
0		Financiranje PDV-a u nabavi i rezerviranje za umanjeno financiranje projekta	3.981.000	1.327.000			1.327.000			1.327.000		
0		Ostale investicije u CGO i PS, idejno rješenje puta do piezometra, idejno rješenje Vis,	708.090	354.045			354.045					
KLASA 0		U K U P N O	112.091.841	7.820.169	12.301.157	17.573.082	13.598.545	19.308.331	27.583.332	3.543.409	4.267.454	6.069.362
4		CGO - Tehnička pomoć	320.000	160.000			160.000			0		
401		Uredski materijal i materijali za čišćenje	39.000	5.000			7.500			26.500		
406		Usluge operativnih troškova pretovarnih stanica, gorivo i struja u fazi testiranja CGO	523.400	0			523.400			0		
407		Potrošena energija (struja, gorivo...)	156.900	11.000			39.800			106.100		
410		Troškovi usluga telefona, pošte	21.300	4.800			6.000			10.500		

411	Troškovi vanjskih usluga i ostale usluge	27.800	8.000			8.900			10.900		
412	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zaštite na radu i monitoringa	80.500	12.500			19.900			48.100		
413	Registracija vozila i osiguranje	146.600	3.900			5.300			137.400		
414	Zakupnine i najamnine	111.570	30.000			40.785			40.785		
415	Promo materijali i ostali troškovi PR (sajmovi, edukacije, oglasi,)	52.700	8.000			8.000			36.700		
416	Drugi dohodak	18.000	5.600			6.200			6.200		
416	Konzultantske usluge, savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, prevoditelji	582.000	194.000			194.000			194.000		
416	Dokumentacija i troškovi postupka u javnoj nabavi za CGO i PS	39.900	13.300			13.300			13.300		
417	Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja produkata obrade za vrijeme pokusnog rada	59.800	2.700			2.700			54.400		
419	Ostali nespomenuti rashodi	73.000	9.600			37.600			25.800		
420	Plaće i doprinosi za redovni rad	2.752.500	500.000			550.000			1.702.500		
460	Naknade za službeni put, dnevnice, noćenje, prijevoz, cestarine i sl.	86.000	13.000			20.000			53.000		
461	Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte)	164.200	7.000			13.000			144.200		
461	Ostali rashodi za zaposlene	281.600	28.700			36.600			216.300		
462	Naknade NO	49.980	16.660			16.660			16.660		
463	Reprezentacija	18.000	5.000			5.000			8.000		
464	Osiguranje, zaposlenika, imovine	69.800	3.500			6.600			59.700		
465	Bankarske usluge, tečajne razlike	11.000	3.300			3.700			4.000		
469	Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura	37.500	7.300			8.200			22.000		
473	Ugovorene kamate na kredite banaka	1.537.608	512.536			512.536			512.536		
KLASA 4	U K U P N O	7.260.658	1.565.396			2.245.681			3.449.581		
	U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4)	119.352.499	9.385.565	12.301.157	17.573.082	15.844.226	19.308.331	27.583.332	6.992.990	4.267.454	6.069.362

KLASA: 11.02.01/001

URBROJ: 01-24-944

Split, 30. prosinca 2024. godine
