



**REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA**

Vukovarska 148b
HR -21000 Split • Hrvatska
T: +385(0)21 682 821
F: +385(0)21 490 942



PLAN POSLOVANJA za 2023. godinu

Split, prosinac 2022.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Sadržaj

1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.	3
1.1. Projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji	4
2. Stanje na dan 15. prosinca 2022. godine	5
3. Plan poslovnih aktivnosti za 2023. godinu	12
3.1. Otvaranje gradilišta na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom i na lokacijama pretovarnih stanica u Sinju, Zagvozdu i na otoku Braču	13
3.2. Rješavanje imovinskopравnih odnosa u cilju ishođenja građevinskih dozvola	13
3.3. Provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, provedba novih postupaka javne nabave	14
3.4. Financiranje troškova Projekta podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava	14
3.5. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za II. fazu realizacije	15
3.6. Aktivnosti vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta	16
3.7. Upravljanje rizicima	16
4. Plan zapošljavanja	17
5. Financijski dio	17

1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

- REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je županijska komunalna tvrtka za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: RCČO d.o.o.) osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: SDŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u RCČO d.o.o.
- RCČO d.o.o. je upisan u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta MBS: 060207999
- Osobni identifikacijski broj (OIB): 54045399638
- Adresa sjedišta: Vukovarska 148 b, 21000 Split
- Predmet poslovanja: Gospodarenje otpadom na području SDŽ
- Djelatnost u skladu sa nacionalnom klasifikacijom djelatnosti NKD: 3900, Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
- Osoba ovlaštena za zastupanje RCČO d.o.o. je direktor Ivan Vukorepa, struč. spec. oec.
- Organi RCČO d.o.o. su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava RCČO d.o.o.

RCČO d.o.o. uspostavljen je s ciljem obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, a za što je potrebno izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom - Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji na lokaciji Kladnjice, Općina Lećevica i šest pretovarnih stanica u Splitu, Sinju, Zagvozdu, te na otocima Braču, Hvaru i na Visu.



Slika 1: Prikaz lokacija i povezanosti pretovarnih stanica s Centrom za gospodarenje otpadom


1.1. Projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zakonsku osnovu nalazi u Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. (NN 3/2017, 1/2022).

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, Zakon), centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada (Čl. 4. st. 1. toč. 6. Zakona), te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja (Čl. 10. st. 1. Zakona). Centrom za gospodarenje otpadom upravlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave (Čl. 13. Zakona). Priprema projekta i izgradnja CGO-a je navedena i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/2017), Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom odnosno Mjera 1.4.3. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom, Aktivnost/program/projekt 1.4.3.4. Priprema projekta i izgradnja CGO Lećevica sukladno Izmjenama Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 1/2022).

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno sa šest pretovarnih stanica (Projekt) predstavlja važan dio cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom koji je potrebno uspostaviti na županijskoj razini, a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014.-2020.), Specifični cilj 6.1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i Zakona o gospodarenju otpadom, na razini RH.

Projekt obuhvaća ulaganje u izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica te nabavu opreme za rad istih. Razvoj Projekta planiran je u tri faze:

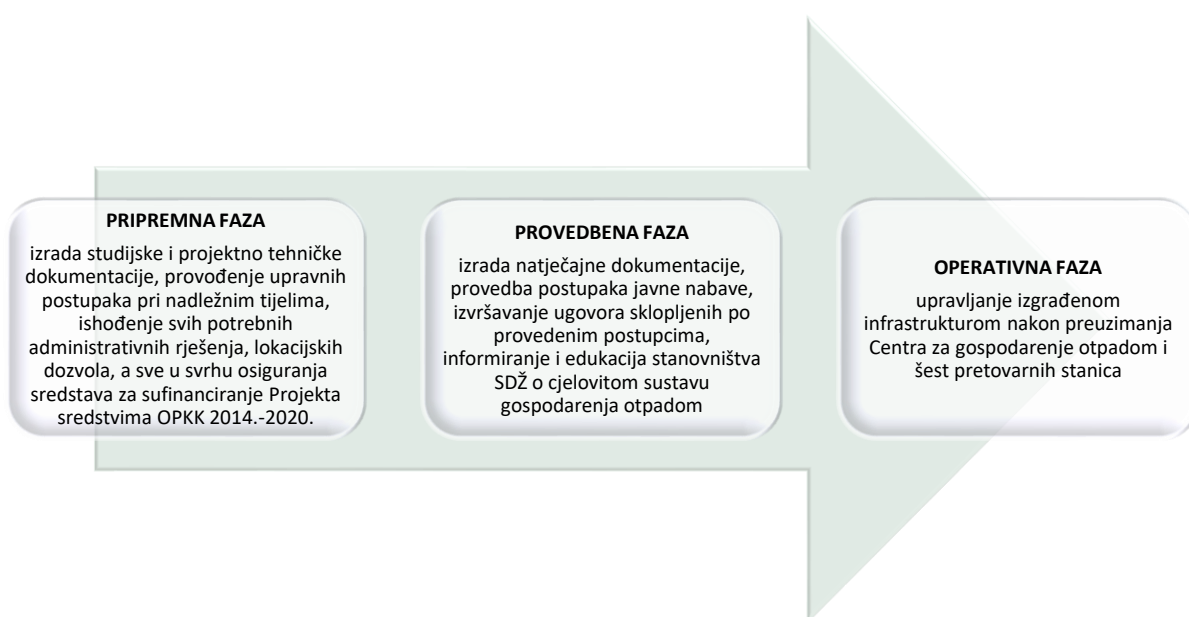

2. Stanje na dan 15. prosinca 2022. godine

Financiranje i faziranje Projekta

Sredstva za financiranje Projekta osigurana su iz četiri izvora: sredstva Europske unije, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i sredstva Splitsko-dalmatinske županije.

Temeljem Smjernica tehničke pomoći JASPERS za prilagodbu projekata centara za gospodarenje otpadom i regionalnih sustava gospodarenja otpadom ciljevima kružnog gospodarstva u Hrvatskoj, a kojim se Smjernicama centrima koji imaju potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz prošlog financijskog okvira EU, a koja trebaju biti iskorištena do kraja 2023. godine, predlaže faziranje projekata izgradnje na način da se u navedenom vremenskom razdoblju izgrade oni dijelovi centara koji, zbog promjena u EU direktivama, neće moći biti financirani iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira EU (VFO EU), projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO u SDŽ) će se realizirati u dvije faze.

1. faza realizacije obuhvaća projektiranje kompletnog CGO u SDŽ s građenjem dijela CGO u SDŽ (građenje Faza 1, Faza 2, Faza 4, Faza 8a i Faza 9a, odnosno izgradnja trafostanice, prometnica, obodnog kanala oko odlagališta, upravne zgrade i odlagališnih ploha kazeta 1 i 6-1 te izrada glavnog projekta za sve faze i ishođenje svih građevinskih dozvola) s tim da je u odnosu na ishođenu Lokacijsku dozvolu razlika što bi se u Fazi 1 izvela i obodna prometnica i obodni kanal oko cijelog odlagališta te je istom fazom predviđeno i krčenje cijele parcele i niveliranje terena cijele parcele po potrebi. Ova faza realizacije CGO u SDŽ sufinancirala bi se bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz postojećeg Operativnog programa 2014.-2020.

2. faza realizacije obuhvaća projektiranje i građenje preostalog dijela CGO u SDŽ koji nije obuhvaćen 1. fazom realizacije, a za što bi se javna nabava provela kad se za to stvore svi potrebni preduvjeti. Ova faza realizacije CGO u SDŽ sufinancirala bi se bespovratnim sredstvima kohezijske politike EU iz novog Operativnog programa 2021.-2027.

Javna nabava velike vrijednosti za 1. fazu realizacije Projekta, ugovaranje

Po izrađenoj Dokumentaciji o nabavi (DoN) za **Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 1. faza realizacije**, u periodu od 11.07.2022. do 18.07.2022. godine provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Dana 20.07.2022. godine objavljeno je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, te je isti dan DoN, zajedno s navedenim Izvješćem, dostavljen na ex ante provjeru od strane nadležnih institucija. Putem Elektroničkog oglasnika javne nabave pokrenut je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 1. faza realizacije koji je objavljen 25.07.2022. godine. Prvotni rok za dostavu ponuda bio je 07.09.2022. godine, te se isti pomicao za dan 15.09.2022.

godine i konačni 26.09.2022. godine. Pristizala su pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata, objavljujuna su Pojašnjenja i Obavijesti o izmjeni DoN-a.

Procijenjena vrijednost ove nabave iznosi 146.000.000,00 kuna bez PDV-a/19.377.530,03 eura. Izvršenim javnim otvaranjem ponuda na dan 26.09.2022. godine utvrđeno je kako su zaprimljene 3 ponude i to:

1. ponuda Zajednice ponuditelja SARAĐEN d.o.o., GH Holding d.o.o. i VGP DRAVA Ptuj d.o.o. u iznosu od 155.577.118,70 kuna bez PDV-a/20.648.632,12 eura,
2. ponuda Zajednice ponuditelja Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d. i KOSTAK-GRADITELJSTVO TEHNOLOGIJA SIROVINE d.o.o. u iznosu od 233.333.908,00 kuna bez PDV-a/30.968.731,57 eura, te
3. ponuda Zajednice ponuditelja G.T. Trade d.o.o. i MUNDO MELIUS d.o.o. u iznosu od 195.640.827,00 kuna bez PDV-a/25.966.000 eura.

Izvršen je pregled i ocjena pristiglih ponuda te je 07.11.2022. godine donesena Odluka o odabiru ponuditelja čija je ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda Zajednice ponuditelja: SARAĐEN d.o.o., GH Holding d.o.o. i VGP DRAVA Ptuj d.o.o. za cijenu ponude od 155.577.118,70 kuna bez PDV-a/20.648.632,12 eura. Dana 06.12.2022. godine pristupilo se sklapanju Ugovora o projektiranju i građenju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije s odabranom Zajednicom gospodarskih subjekata: SARAĐEN d.o.o., GH Holding d.o.o. i VGP DRAVA Ptuj d.o.o. za Ugovornu cijenu od 155.577.118,70 kuna bez PDV-a/20.648.632,12 eura.



Slika 2: Potpisivanje Ugovora o projektiranju i građenju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije (6.12.2022. godine, prostorije Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Zagreb)

Ažuriranje Projektne dokumentacije

U skladu sa zaključcima sa sastanaka s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, zbog izmjene faznosti u odnosu na već postojeću Lokacijsku dozvolu za CGO u SDŽ, RCČO d.o.o. je naručio izradu Idejnog projekta za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole, te je ishođena I. izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za izgradnju CGO u SDŽ, od 28.07.2022. godine (postala pravomoćna dana 09.09.2022. godine).

Dana 02.11.2022. godine u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dostavljen je zahtjev za izdavanjem Potvrde o usklađenosti zahvata CGO u SDŽ sa prostornim planovima, a u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dostavljen je zahtjev za pokretanjem postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Rješavanje imovinskopravnih pitanja na lokaciji CGO u SDŽ (Kladnjice, Općina Lećevica), provedba administrativnih i pravnih procedura

Postupak izvlaštenja zemljišta u privatnom vlasništvu

U postupku potpunog izvlaštenja privatnog dijela zemljišta u svrhu izgradnje CGO u SDŽ, na temelju izvršenih očevida, procjembenih elaborata izrađenih od strane stalnih sudskih vještaka za graditeljstvo i poljoprivredu, ishođena su Rješenja o izvlaštenju Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske županije, a temeljem kojih su slijedile i isplate od strane RCČO d.o.o.

Rješenja o izvlaštenju izdana su u periodu od 25.08.2022. do 16.09.2022. godine. U SDŽ je otvoren poseban račun kako bi RCČO d.o.o. mogao izvršiti isplatu naknade za izvlašteno zemljište određene rješenjem o izvlaštenju za one izvlaštenike koji nisu dostavili brojeve računa.

Temeljem Rješenja o izvlaštenju isplaćena je naknada za izvlašteno zemljište na račune fizičkih osoba i na poseban račun SDŽ u ukupnom iznosu od 3.940.540,20 kuna/522.999,56 eura na dan 19.10.2022. godine.

Izvršavanje sklopljenih ugovora

Tijekom 2022. godine izvršavani su ugovori čija se provedba financira u okviru Projekta i to za:

- ✓ **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ** (Ugovor od 29.05.2019. godine); odabrani izvršitelj Zajednica ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb; INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb i INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 10.077.050,00 kuna bez PDV-a/1.337.454,38 eura, odnosno 12.596.312,50 kuna s PDV-om/1.671.817,97 eura
- ✓ **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ** (Ugovor od 29.07.2019. godine); odabrani izvršitelj Zajednica ponuditelja: MERITUM INŽENJERING d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split; EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, 10 000 Zagreb i IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za

izvršenje usluga od 3.766.997,60 kuna bez PDV-a/499.966,50 eura, odnosno 4.708.747,00 kuna s PDV-om/624.958,13 eura

- ✓ **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ** (Ugovor od 22.02.2019. godine); odabrani izvršitelj predmetne usluge je MEDIA VAL d.o.o. (sada: VAL GRUPA KOMUNIKACIJE d.o.o.), Ulica grada Vukovara 269D, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 1.261.664,04 kuna bez PDV-a/167.451,59 eura, odnosno 1.577.080,05 kuna s PDV-om/209.314,49 eura

te ugovora koji se financira isključivo sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost:

- ✓ **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ** (Ugovor od 04.07.2019. godine); odabrani ponuditelj GEOPROJEKT, d.d., Sukoišanska 43, 21 000 Split na iznos od 639.000,00 kuna bez PDV-a/84.809,87 eura, odnosno 798.750,00 kuna s PDV-om/106.012,34 eura.

Projektiranje pretovarnih stanica, ishođenje građevinskih dozvola, javna nabava



Ishođena građevinska dozvola za PS Zagvoz 13.07.2021. godine, pravomoćna 29.07.2021. godine



Ishođena građevinska dozvola za PS Brač 17.03.2022. godine, postala pravomoćna 17.04.2022. godine



Ishođena građevinska dozvola za PS Sinj 16.02.2022. godine, postala pravomoćna 09.03.2022. godine



17.02.2022. godine podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za PS Split



Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola s datumom pravomoćnosti 23.06.2021. godine. Predan je zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 16.05.2022. godine. Dana 24.10.2022. godine zaprimljena je obavijest od nadležnog Ministarstva o produljenju postupka OPUO dok se ne zaprimu sva zatražena mišljenja nadležnih tijela u postupku. Glavni projekt je izrađen. Ne može se podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dok Grad Stari Grad ne riješi imovinsko-pravne odnose iz svoje nadležnosti



Za PS Vis izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole može započeti kada Grad Vis naruči novi idejni projekt i ishodi lokacijsku dozvolu za Odlagalište Wellington u sklopu kojeg se nalazi PS Vis

Javna nabava velike vrijednosti za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd

S obzirom na ishođene pravomoćne građevinske dozvole za PS Zagvozd, PS Brač i PS Sinj, izrađen je DoN za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd, te je dana 21.10.2022. godine objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji u trajanju do 28.10.2022. godine. Temeljem analize trenutnih tržišnih cijena građevinskih radova i materijala, procijenjena vrijednost nabave za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd iznosi 40.200.000,00 kuna bez PDV-a/5.335.456,90 eura. Predmet nabave je podijeljen u tri grupe te procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi 13.000.000,00 kuna/1.725.396,51 eura za PS Sinj, 14.300.000,00 kuna/1.897.936,16 eura za PS Brač te 12.900.000,00 kuna/1.712.124,23 eura za PS Zagvozd.

Dana 04.11.2022. godine, DoN za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd, dostavljen je na ex ante provjeru od strane nadležnih institucija te je putem EOJN pokrenut otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmetnu nabavu koji je objavljen 07.11.2022. godine. Dana 13.12.2022. godine dostavljeno je Izvješće sa ex ante provjere.

Javna nabava male vrijednosti za Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd

Izrađena je Dokumentacija o nabavi za Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd za koje su ishođene pravomoćne građevinske dozvole. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 804.000,00 kuna bez PDV-a/106.709,14 eura.

Dana 02.11.2022. godine putem EOJN pokrenut je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvoz koji je objavljen 03.11.2022. godine. Dana 30. studenog 2022. godine izvršeno je javno otvaranje ponuda, te s obzirom da je postupak bio podijeljen u grupe, u sve tri grupe zaprimljena je po jedna ponuda ponuditelja INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, a sve su ponude niže od procijenjene vrijednosti nabave.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi izvršen je postupak pregleda i ocjene pristiglih ponuda, te su na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda donesene Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude i to za sljedeće grupe: Grupa 1. Usluge stručnog nadzora građenja Pretovarne stanice Sinj za cijenu ponude od 198.000,00 kuna bez PDV-a/26.279,12 eura, Grupa 2. Usluge stručnog nadzora građenja Pretovarne stanice Brač za cijenu ponude od 235.000,00 kuna bez PDV-a/31.189,86 eura i Grupa 3. Usluge stručnog nadzora građenja Pretovarne stanice Zagvoz za cijenu ponude od 212.000,00 kuna bez PDV-a/28.137,24 eura, za sve grupe prema ponudi gospodarskog subjekta INSTITUT IGH d.d.

Infrastrukturni radovi do lokacija CGO i PS

RCČO d.o.o. je kontinuirano pratilo pripremu izrade dokumentacije i ishođenja dozvola u koordinaciji s dionicima projekta (HEP, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Županijska uprava za ceste, Hrvatski Telekom, jedinice lokalne samouprave) za izgradnju infrastrukture do svake od 7 lokacija Projekta.

INFRASTRUKTURA DO LOKACIJE CGO

CESTA	Izgrađen prometni priključak od županijske ceste do lokacije CGO, te je u 2020. godini ishođena Privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju raskrižja nerazvrstane ceste za CGO i županijske ceste Ž6098 Građevinska dozvola za 2. dionicu Ž 6098 i 6115 obuhvaća elektroenergetski priključak na CGO i priključak vode na CGO – proveden je postupak javne nabave za izbor izvođača radova, u svibnju 2022. godine dostavljen je prijedlog Odluke o odabiru izvođača radova za Rekonstrukciju i djelomično izmještanje cesta Ž 6098 i 6115 – 2. dionica i dio 1. dionice, Odjelu za javnu nabavu u HEP Zagreb na suglasnost. U srpnju 2022. godine donesena je Odluka o odabiru za Izvođača radova te je u rujnu 2022. godine potpisan ugovor s izvođačem radova za izgradnju cijele 2. dionice (obilaznica mjesta Lečevica) i dio 1. dionice gdje će se položiti instalacije za CGO. Planirani rok za izvođenje je 12 mjeseci te bi radovi trebali biti gotovi do kraja 2023. godine. Radovi u tijeku. Objava javne nabave za građenje drugog dijela 1. dionice te 3. dionice, planirana je u prvoj polovici 2023. godine.
ELEKTROENERGETIKA	Sklopljen Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu Izgradnja Trafostanice Lečevica – u rujnu 2022. godine HEP je izvijestio kako su građevinski radovi u tijeku (montaža krova i fasada) Građevinska dozvola za elektroenergetski kabel KB 35 kV Uble do trafostanice u Općini Lečevica - građevinski radovi u tijeku

	Priključak na telekomunikacijsku mrežu će se izvesti prema suglasnosti nadležnog operatera, osigurano je financiranje izgradnje TK instalacija od Kladnjica do CGO od strane ŽUC-a, dok je RCČO d.o.o. preuzeo izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola
VODOOPSKRBA	Građevinska dozvola za Dionicu 0 – kroz zaseok Taraši i Dionicu IV – kroz zaseok Barani – proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, u srpnju 2020. godine izvođač je uveden u posao. U svibnju 2022. godine, ViK je izvijestio da su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda završeni, a da se tehnički pregled može obaviti po izgradnji cijelog vodoopskrbnog sustava predviđenog u sklopu izgradnje Rekonstrukcije i djelomičnog izmještanja cesta Ž 6098 i 6115 – 1., 2. i 3. dionice Dionica V – Objekti vodoopskrbe za CGO – u svibnju 2022. godine ViK je izvijestio kako se rješavaju imovinskopравни odnosi, u međuvremenu je istekla lokacijska dozvola predmetnog zahvata te je ViK poduzeo sve radnje u svrhu podnošenja zahtjeva za ishođenje novih posebnih uvjeta, lokacijske dozvole te građevinske dozvole. Dana 05.10.2022. godine iz ViK-a su izvijestili kako je preko sustava eDozvola na taj datum predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Dana 28.11.2022. godine ishođena je Lokacijska dozvola za VS i procrpnicu Centar, pristupni put i vodoopskrbni cjevovod.
INFRASTRUKTURA DO LOKACIJA PS	
PS SPLIT	Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola za cestu Put Kamena s priključkom do PS Split. Po ovjeri svih parcelacijskih elaborata, pokrenut će se postupak otkupa zemljišta i javna nabava za izgradnju. U studenom 2020. godine potpisan je ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta za cestu Put Kamena. Upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije za imovinsko-pravne poslove je izvršio osiguranje dokaza na nekretninama u zahvatu izgradnje ceste Put Kamena, te je izrađena procjena sudskog vještaka temeljem koje je započelo rješavanje imovinskopравnih odnosa. Ishođena građevinska dozvola za cestu Put Kamena je preduvjet da bi se mogla zatražiti građevinska dozvola za PS Split
PS SINJ	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu unutar gospodarske zone Kukuzovac do PS Sinj s potrebnom infrastrukturom. U prosincu 2020. godine Županijska skupština SDŽ donijela je odluku o sufinanciranju izgradnje prometnice s infrastrukturom do PS Sinj. U skladu s Proračunom Grada Sinja, trebao bi se pokrenut postupak javne nabave za gradnju. Prema posljednjim informacijama još nije potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Sinjom
PS ZAGVOZD	Ishođena građevinska dozvola za pristupnu cestu od D76 do PS Zagvozd. U rujnu 2020. godine je pokrenut postupak javne nabave za izgradnju pristupne ceste, potpisan je ugovor s Izvođačem radova i sa Stručnim nadzorom. Po rješavanju imovinskopравnih odnosa pristupilo se uvođenju izvođača u posao. U veljači 2022. godine radovi na izgradnji priključka za PS Zagvozd su završeni, te je 06.04.2022. godine izdana Privremena uporabna dozvola za Prometni priključak za PS Zagvozd.
PS VIS	Planiranje i izgradnja infrastrukture do PS može započeti tek nakon što Grad Vis isходи lokacijsku dozvolu za odlagalište Wellington.
PS BRAČ, OPĆINA PUČIŠĆA	Ishođena pravomoćna građevinska dozvola pristupne ceste od D113 do PS Brač. Osigurani izvor financiranja. Pristupna cesta je izgrađena, izvršen je tehnički pregled te je izdana privremena uporabna dozvola

	Izgrađen Priključak na D113. Predan je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za Priključak na D113.
PS STARI GRAD NA HVARU	Ishođeno Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvola za Priključak pretovarne stanice Stari Grad na Hvaru na županijsku cestu ŽC6252. U svibnju 2022. godine naručena je izrada Izmjene i dopune idejnog projekta Prometnog priključka do PS Stari Grad na Hvaru i izrada nove Geodetske podloge za isto. Sva dokumentacija je izrađena ali se zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu za PS Stari Grad na Hvaru ne može poništiti lokacijska dozvola za PS Stari Grad, a što je uvjet da bi se mogao predati zahtjev za izmjenju i dopunu lokacijske dozvole Prometnog priključka do PS Stari Grad na Hvaru.

3. Plan poslovnih aktivnosti za 2023. godinu

Aktivnosti i ciljevi RCCO d.o.o. 2023.-2025.



Slika 3: Simulacija prikaza obuhvata Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u Kladnjicama

S obzirom na sklapanje Ugovora o projektiranju i građenju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije s odabranom Zajednicom gospodarskih subjekata krajem 2022. godine, kao jedna od važnijih planiranih aktivnosti za 2023. godinu usmjerena je na realizaciju navedenog Ugovora. Također, početkom 2023. godine planiran je završetak postupka javne nabave za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd, planirana je provedba novih postupaka javne nabave kako bi se izgradnja i opremanje CGO-a i PS odvijalo usklađeno tijekom sljedećeg razdoblja, izvršavanje već sklopljenih ugovora o javnoj nabavi kao i okončanje dugotrajnih administrativnih i pravnih procedura.

Planirane aktivnosti za 2023. godinu u nastavku teksta:

3.1. Otvaranje gradilišta na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom i na lokacijama pretovarnih stanica u Sinju, Zagvozdu i na otoku Braču

➤ Realizacija Ugovora o projektiranju i građenju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije

Uvjeti Ugovora o projektiranju i građenju CGO u SDŽ, 1. faza realizacije sadrže "Opće uvjete" koji su dio "Uvjeta ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje" prvo izdanje 1999 izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu, te Posebne uvjete koji uključuju izmjene i dopune Općih uvjeta. To znači da će ugovoreni izvođač najprije izraditi Glavni projekt i ishoditi građevinske dozvole.

Rok za dovršetak 1. faze realizacije Projekta je 14 mjeseci.

➤ Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvoz

Po objavljenim javnim nabavama u 2022. godini za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvoz i Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvoz, u 2023. godini planiran je dovršetak postupaka javne nabave, donošenje odluka o odabiru te sklapanje pripadajućih ugovora temeljem kojih bi započelo građenje pretovarnih stanica za koje su ishođene pravomoćne građevinske dozvole i to na lokacijama u Sinju, Zagvozdu i na otoku Braču.

3.2. Rješavanje imovinskopravnih odnosa u cilju ishođenja građevinskih dozvola

➤ Lokacija Centra za gospodarenje otpadom - Šilovića Doci, Kladnjice, Općina Lećevica

Po okončanju postupka izvlaštenja zemljišta od privatnih vlasnika odnosno uknjižbom vlasništva zemljišta na RCČO d.o.o., prijenosom vlasništva zemljišta sa SDŽ (darovanog od strane Republike Hrvatske) na RCČO d.o.o. i to nekretnina: zk.č.br. 2710/34, zk.č.br. 2710/36 i zk.č.br. 2710/37, te po uknjižbi vlasništva zemljišta prethodnim darovanjem Općine Lećevica Splitsko-dalmatinskoj županiji i prijenosa u vlasništvo RCČO d.o.o. nekretnina označenih kao zk.č.br. 2692 i zk.č.br. 2693, formirat će se jedinstvena građevinska čestica.

➤ Lokacija pretovarnih stanica Hvar i Vis

U 2023. godini očekuje se okončanje upravnih postupaka a koji nisu u nadležnosti RCČO d.o.o.-a, slijedom čega će se ostvariti uvjeti za ishođenje građevinskih dozvola i sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja.

3.3. Provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, provedba novih postupaka javne nabave, ugovaranje

- U 2023. godini planirana je provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, i to za:
- Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ
 - Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, 1. faza realizacije
 - Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ
 - Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ
 - Usluge arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji CGO u SDŽ
 - Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ,

kao i sklapanje te provedba ugovora o javnoj nabavi planiranih u 2023. godini, i to za:

- Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvoz
 - Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvoz.
- Dokumentacija o nabavi za sljedeće predmete nabave planira se izraditi u suradnji s Tehničkom pomoći/Konzultantom temeljem Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja Projektom, i to za:
- Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Split, PS Hvar i PS Vis
 - Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Split, PS Hvar i PS Vis
 - Pokretna oprema za CGO u SDŽ
 - Pokretna oprema za 6 PS u SDŽ.

3.4. Financiranje troškova Projekta podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava

Sukladno odredbama Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) – (Prilog II Ugovora - Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.), RCCO d.o.o./Korisnik je obavezan tijekom izvršavanja Ugovora podnositi PT-u2 sljedeća izvješća: izvješća o napretku, završno izvješće o provedbi Projekta te izvješće nakon provedbe Projekta, te ista dostavljati na obrascu Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Predmetna izvješća se

odnose na ugovoreni Projekt u cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadržajno moraju zadovoljavati sve ugovorene uvjete, sukladno članku 14. stavku 14.1. Priloga II Općih uvjeta Ugovora.

Plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava Projekta, RCČO d.o.o./Korisnik potražuje podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava PT-u2 kroz sustav „eFondovi“. Zahtjevi za nadoknadom sredstava moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom o nastalim i potraživanim prihvatljivim troškovima Projekta, a sve sukladno članku 15. stavku 15.6. Priloga II Općih uvjeta Ugovora.

Dijelove neprihvatljivih projektnih troškova snose SDŽ i Fond (u manjem dijelu), obzirom na članak 6. stavak 6.3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) kojim je određeno da je RCČO d.o.o./Korisnik obvezno osigurati kontinuirano financiranje Projekta te snositi sve Projektne troškove osim prihvatljivih troškova koji su financirani bespovratnim sredstvima.

U skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kapitalne pomoći Fonda koji se sufinanciraju sredstvima OPKK, Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (referentni broj ugovora: JPF.2020.-6.529.) i temeljem realizacije aktivnih ugovora, RCČO d.o.o. će i nadalje podnositi Zahtjeve za nadoknadom sredstava s pripadajućim izvješćima o napretku provedbe projekta prema Posredničkom tijelu 2 i Fondu, te će se na taj način izvršavati nadoknade traženih sredstava iz izvora OPKK i Fonda po plaćenim i opravdanim računima za usluge iz Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ, Ugovora o uslugama vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ, Ugovora o uslugama stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ, Ugovora o projektiranju i građenju CGO u SDŽ, 1. faza realizacije i ugovora koji se planiraju sklopiti u 2023. godini kao što su ugovor o uslugama stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvoz, ugovor za građenje 3 pretovarne stanice u SDŽ: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvoz.

U 2023. godini bit će izrađena Izvješća i Zahtjevi za nadoknadom sredstava u broju i u visini iznosa u skladu s realizacijom Projekta.

3.5. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za II. fazu realizacije

S obzirom na faziranje Projekta iz razloga iskorištavanja što više bespovratnih sredstava iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine za projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te s obzirom na činjenicu kako u sljedećem operativnom razdoblju 2021. -2027. EU neće financirati odlagališta ni MBO postrojenja koja će primati isključivo miješani komunalni otpad, već je potrebno napraviti preinaku MBO postrojenja kako bi se u CGO primao i izdvojeni otpad u primarnoj selekciji, potrebno je pripremiti dokumentaciju za II. fazu realizacije Projekta. Za provedbu II. faze realizacije u tijeku je izrada novog Idejnog rješenja za gradnju CGO u SDŽ, nove Studije utjecaja na okoliša, te revizija Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-

dalmatinskoj županiji, kako bi se za Projekt mogla izvršiti projektna prijava na sufinanciranje za „Veliki projekt“.

3.6. Aktivnosti vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta

Kao jedna od vrlo važnih aktivnosti je konstantno upoznavanje i obavješćavanje stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o razvoju samoga Projekta kao i ostalih važnih informacija a koje se objavljuju na internet stranici RCCO d.o.o. i na društvenim mrežama.

Osiguranjem podrške za odnose s javnošću kroz 2023. godinu planiraju se sljedeće aktivnosti:

- Istraživanje tržišta: Istraživanje tržišta II: Istraživanje stavova razine informiranosti na uzorku za stanovnike SDŽ, broj ispitanika: 400, vrijeme provedbe – tri mjeseca prije završetka Ugovora
- Izrada Medijskog plana
- Izrada Strategije odnosa s javnošću za razdoblje od 2024. – 2029.
- Edukacija zaposlenika za javni nastup
- Stručna podrška i savjetovanje Naručitelja u kriznim situacijama, predviđa se 5 mogućih kriznih situacija
- Stručna podrška u upravljanju odnosima s medijima
- Izrada, priprema govora i prezentacija tijekom trajanja Projekta
- Oblikovanje, izrada i dostava promotivnih materijala
- Plan izrade i izrada multimedijских sadržaja
- Edukativna događanja
- Konferencije za medije
- Mjesečno praćenje medija.

3.7. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima redovita je aktivnost RCCO d.o.o.-a čime se omogućuje kontinuirano razmatranje izloženosti Projekta rizicima i postavljanje prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja uspješnosti poslovnih ciljeva.

Osiguranjem podrške za odnose s javnošću, informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta, uključile su se i aktivnosti koje se odnose na izradu Analize situacije i rizika koji se mogu pojaviti tijekom provedbe Projekta koja uključuje fazu javnog nadmetanja, projektiranje i ishođenje dozvola i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica.

U sklopu tromjesečnih izvješća Tehničke pomoći/Konzultanata, ažurira se Registar rizika, analiziraju se i specificiraju aktivnosti koje je potrebno realizirati do početka rada CGO u SDŽ, a nisu pod direktnom ingerencijom RCČO d.o.o.-a.

Jedna od aktivnosti RCČO d.o.o.-a je i praćenje stanja u svezi infrastrukturnih radova do lokacije Centra i pretovarnih stanica a koje radnje nisu u nadležnosti RCČO d.o.o.-a te na njihovu dinamiku ne može utjecati.

RCČO d.o.o. će i u 2023. godini nastaviti s procesom upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i apsorpciju financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 2023. godini.

4. Plan zapošljavanja

Obzirom da je RCČO d.o.o. kao krajnji korisnik sredstava EU Fondova isključivo odgovoran za razvoj i implementaciju sustava po fazama (pripremna, provedbena i operativna faza), nužno je da u RCČO d.o.o.-u budu zaposleni kadrovi određene stručnosti. Plan zapošljavanja u RCČO d.o.o. za 2022. godinu nije realiziran u cijelosti u planiranoj godini, stoga se u 2023. godini planiraju provesti postupci zapošljavanja u RCČO d.o.o., i to sukladno Planu zapošljavanja u RCČO d.o.o. za 2023. godinu (KLASA: 06.01/001, URBROJ: 01-22-570, od 30. studenog 2022. godine) odnosno odredbama Pravilnika o organizaciji RCČO d.o.o. i sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u RCČO d.o.o.

5. Financijski dio

➤ Prihodi i priljevi RCČO d.o.o.

Prihodi

RCČO d.o.o. planira ostvariti financijske prihode na dane pozajmice Općini Lećevica u iznosu 5.000,00 eura i prihode od državnih potpora prema HSFI 15 – Prihodi koji će se priznati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se sučelili s odgovarajućim rashodima. Potraživanja za državne potpore za nadoknadu nastalih troškova u godini treba priznati kao prihod razdoblja u kojem je potraživanje nastalo.

U 2023. godini očekuje se realizacija planiranih prihoda prema OPEX-u u iznosu od 319.030,00 eura za nadoknadu troškova FZOEU i EU fondova prema ugovoru o tehničkoj pomoći i projektnoj vidljivosti, dok se višegodišnji CAPEX planira u iznosu od 26.376.243,00 eura za nadoknadu troškova FZOEU i EU fondova prema ugovorima o projektiranju i građenju, nadzoru radova i nabavi opreme.

RCČO d.o.o. u provedbenoj fazi projekta (razvoj) nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada RCČO d.o.o. Projekt materijalizira tj. po završetku izgradnje i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije).

Priljevi

Redovno poslovanje RCČO d.o.o.-a u potpunosti se financira sredstvima osnivača, Splitsko-dalmatinske županije kao jedinog vlasnika, obzirom da još ne ostvaruje vlastite prihode, i to na temelju odluka Županijske skupštine SDŽ odnosno uplatama/transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Osnivač pri tome neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvoja Projekta.

Proračunom Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 170/22, od 05. prosinca 2022. godine), za RCČO d.o.o. - Projekt osigurana su sredstva za 2023. godinu u iznosu od 8.458.168,00 eura.

RCČO d.o.o. će ostvarivati priljeve iz EU fondova na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) potpisanog sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, iz FZOEU na temelju Ugovora reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta, iz FZOEU na temelju Ugovora broj 2020/018846 Dodatak VI. osnovnog ugovora o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za pripremu i provedbu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Lećevica“ za prijavu za sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda i izgradnje pretovarnih stanica davanjem kapitalne pomoći te na temelju Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta referentni broj ugovora: JPF.2020.- 6.529. potpisanog sa MRRFEU, a sve prema odobrenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava za prihvatljive troškove Projekta u njihovim udjelima prema metodi nadoknade i/ili metodi plaćanja. Zahtjevi za nadoknadom sredstava predavat će se ovisno o uvjetima iz pojedinog ugovora od maksimalno jednom mjesečno ili minimalno jednom godišnje prema pravilima svakog pojedinačnog ugovora za sufinanciranje Projekta.

➤ Odljevi RCČO d.o.o.

RCČO d.o.o. je u financijskom dijelu ovoga Plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu prikazalo ukupne vrijednosti pojedinih stavki projekta i njihovu planiranu financijsku realizaciju kroz vrijeme (Tablica 2).

Investicije

Projekt zajednički financiraju EU fondovi preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na temelju ranije navedenih zaključenih Ugovora o bespovratnim sredstvima i davanjem sredstava kapitalne pomoći, SDŽ kroz odobreni županijski proračun te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Iz navedenih izvora financirat će se nekretnine u pripremi - imovina u obliku tehničko-tehnološke dokumentacije nužne za izvedbu

Projekta, zemljište, građenje, pokretna oprema i sva ostala imovina potrebna za budući Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji te pretovarne stanice.

EU fond preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Splitsko-dalmatinska županija te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 2023. godini financirat će ukupno 34.171.602,00 eura za provedbu Projekta u sljedećim iznosima bez PDV-a (*odljevi za investicije*):

- 7.795.359,00 eura osigurat će SDŽ,
 - Iznos sadrži učešće 10% za prihvatljive troškove projekta u iznosu od 2.954.159,00 eura, pri kojem u sufinanciranju sudjeluje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u postotku od 22% učešća do maksimalnog iznosa od 1.327.228,08 eura
- 20.801.213,00 eura osigurat će EU i
- 5.575.030,00 eura kn osigurat će FZOEU.

Rashodi

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje glavnice.

EU fond preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Splitsko-dalmatinska županija te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 2023. godini financirat će ukupno 981.839,00 eura za provedbu Projekta u sljedećim iznosima bez PDV-a (*odljevi za rashode*):

- 662.809,00 eura osigurat će SDŽ kroz povećanje kapitala,
 - Iznos sadrži učešće 10% za prihvatljive troškove projekta u iznosu od 35.448,00 eura, pri kojem u sufinanciranju sudjeluje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u postotku od 22% učešća do maksimalnog iznosa od 1.327.228,08 eura
- 251.731,00 eura osigurat će EU i
- 67.299,00 eura osigurat će FZOEU.

U 2023. godini sve aktivnosti RCCO d.o.o.-a financirat će se kako slijedi prema *Tablici 1.*

Tablica 1. Plan financiranja provedbe Projekta u 2023. godini

PLAN FINANCIRANJA PROVEDBE PROJEKTA U 2023. GODINI				
Aktivnosti	Izvori financiranja	SDŽ (u €)	EU (u €)	FOND (u €)
Provedba Projekta Neprihvatljivi troškovi za OPEX poslovanja	Sredstva iz proračuna SDŽ	627.361,00		
Provedba Projekta Neprihvatljivi troškovi za CAPEX poslovanja	Sredstva iz proračuna SDŽ	4.841.200,00		
Provedba Projekta Prihvatljivi troškovi OPEX	Sukladno osiguranim sredstvima iz proračuna SDŽ, EU FONDOVA i FZOEU	35.448,00	251.731,00	67.299,00
Provedba Projekta Prihvatljivi troškovi CAPEX	Sukladno osiguranim sredstvima iz proračuna SDŽ, EU FONDOVA i FZOEU	2.954.159,00	20.801.213,00	5.561.094,00
Provedba Projekta Sufinancirani troškovi CAPEX	Sukladno osiguranim sredstvima od strane FZOEU			13.936,00
SVEUKUPNO		8.458.168,00	21.052.944,00	5.642.329,00

U nastavku dajemo tablični prikaz Računskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te plan investicija bez poreza na dodanu vrijednost (Tablica 2).

Tablica 2: Plan poslovanja RCČO d.o.o. za 2023. godinu i procjena za 2024. i 2025. godinu s planom investicija

PLAN POSLOVANJA RCČO d.o.o. ZA 2023. GODINU I PROCJENA ZA 2024. I 2025. GODINU SA SUFINANCIRANJEM IZ EU I FZOEU

Računski plan za poduzetnike	EU	Opis	Procijenjena vrijednost	2023			2024			2025		
				SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU
0	EU	Kupnja zemljišta	593.111		125.116	467.995						
	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje I faza	20.648.632	2.064.863	3.920.221	14.663.548						
	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje I faza ugovorne odredbe	1.937.753	193.775	367.890	1.376.088						
0	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje II faza	26.126.356				2.612.636	3.185.018	11.913.528		1.775.170	6.640.004
0	EU	CGO - Ugovor o nadzoru radova	1.513.040	151.304	114.651	428.849		172.606	645.630			
0	EU	PS - Ugovor o radovima za 6 PS, građenje 3 PS II faza	4.983.547				498.355	946.145	3.539.047			
0	EU	PS - Ugovor o nadzoru radova	100.869				10.087	19.150	71.632			
0	EU	CGO - oprema	2.992.793							299.279	568.193	2.125.321
0	Anex EU	PS - Ugovor o radovima za 6 PS, građenje 3 PS Anex EU ugovora I faza	5.335.457	533.546	1.012.957	3.788.954						

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA 2023

0	Anex EU	Rezerviranje za nabave veće od procjenjene (po JN) II faza	28.306.182				2.830.618	5.378.175	20.097.389			
	Anex EU	PS - Ugovor o nadzoru radova 3PS I faza	106.709	10.671	20.259	75.779						
010		Tehničko-tehnološka dokumentacija I i II faze, projekti, elaborati, prevođenje, usluge, dozvole	286.700	238.900			23.900			23.900		
010		Doprinosi za CGO i 6 PS (građevinske dozvole, uporabna dozvola, komunalni i vodni doprinosi)	2.269.500	2.269.500								
010		Projektiranje glavnih projekata 6 pretovarnih stanica i projektiranje glavnog projekta za pristupnu prometnicu do PS	39.363	5.300	13.936			20.127				
012		Ulaganje na tuđoj imovini	15.900	5.300			5.300			5.300		
020		Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - troškovi odvjetnika, ugovora/rješenja, upisa čestica, parcelizacija, javnog bilježnika, poreza i svih ostalih neprihvatljivih troškova u procesu izvlaštenja	197.500	197.500								
027		Priključak na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu,	912.000	265.500			646.500					
037		Pokretna oprema PS	5.176.200							5.176.200		
037		Putničko vozilo i terensko vozilo	33.200	33.200								
037		Informatička oprema i software	396.100	18.800			86.300			291.000		
037		Uredska oprema i inventar	285.100	15.400			68.500			201.200		



REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA 2023

037		Ugradnja piezometara	597.300	464.700			132.600					
037		Oprema za laboratorij i PS, meterološka postaja, solari	451.300				93.000			358.300		
0		Financiranje PDV-a u nabavi i rezerviranje za umanjeno financiranje projekta	3.715.700	1.061.700			1.327.000			1.327.000		
0		Ostale investicije u CGO i PS, Arheološka istraživanja, studija izvedivosti, idejno rješenje puta do piezometra, idejno rješenje Vis,	796.200	265.400			265.400			265.400		
KLASA 0		UKUPNO	107.816.512	7.795.359	5.575.030	20.801.213	8.600.196	9.721.221	36.267.226	7.947.579	2.343.363	8.765.325
4	EU	CGO - TA - Tehnička pomoć	914.802	23.890	45.356	169.655	67.590	128.322	479.989	0		
4	EU	CGO - PR - Odnosi s javnošću	149.865	11.558	21.943	82.076	3.429	6.510	24.349	0		
401		Uredski materijal i materijali za čišćenje	44.600	8.600			9.500			26.500		
406		Usluge operativnih troškova pretovarnih stanica, gorivo i struja u fazi testiranja CGO	523.400	0			0			523.400		
407		Potrošena energija (struja, gorivo...)	158.200	12.300			39.800			106.100		
410		Troškovi usluga telefona, pošte	23.300	4.800			8.000			10.500		
411		Troškovi vanjskih usluga i ostale usluge	27.800	8.000			8.900			10.900		
412		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zaštite na radu i monitoringa	77.500	9.500			19.900			48.100		
413		Registracija vozila i osiguranje	146.600	3.900			5.300			137.400		
414		Zakupnine i najamnine	122.367	40.561			40.785			41.021		
415		Promo materijali i ostali troškovi PR (sajmovi, edukacije, oglasi,)	56.700	9.900			10.100			36.700		
416		Drugi dohodak	18.000	5.600			6.200			6.200		



REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA 2023

416	Konzultantske usluge, savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, prevoditelji	192.600	47.900			50.900			93.800		
416	Dokumentacija i troškovi postupka u javnoj nabavi za CGO i PS	39.900	13.300			13.300			13.300		
417	Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja produkata obrade za vrijeme pokusnog rada	59.700	2.700			2.600			54.400		
419	Ostali nespomenuti rashodi	73.000	9.600			37.600			25.800		
420	Plaće i doprinosi za redovni rad	2.562.500	350.400			509.600			1.702.500		
460	Naknade za službeni put, dnevnice, noćenje, prijevoz, cestarine i sl.	130.000	24.000			53.000			53.000		
461	Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte)	166.800	9.600			13.000			144.200		
461	Ostali rashodi za zaposlene	281.600	28.700			36.600			216.300		
462	Naknade NO	49.800	15.900			16.600			17.300		
463	Reprezentacija	25.900	8.000			8.600			9.300		
464	Osiguranje, zaposlenika, imovine	69.800	3.500			6.600			59.700		
465	Bankarske usluge, tečajne razlike	11.000	3.300			3.700			4.000		
469	Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura	37.500	7.300			8.200			22.000		
KLASA 4	U K U P N O	5.963.234	662.809	67.299	251.731	979.804	134.832	504.338	3.362.421	0	0
	U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4)	113.779.746	8.458.168	5.642.329	21.052.944	9.580.000	9.856.053	36.771.564	11.310.000	2.343.363	8.765.325

KLASA: 11.02.01/001

URBROJ: 01-22-653

Split, 27. prosinca 2022. godine

