REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA

Vukovarska 148b
HR -21000 Split • Hrvatska
T: +385(0)21 682 821
F: +385(0)21 490 942

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

PLAN POSLOVANJA

za 2021. godinu

Split, prosinca 2020.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija
Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Sadržaj

1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. 3

1.1. Opis djelatnosti 4

1.2. Osnovni podaci o Projektu 5

1.3. Izvori financiranja Projekta 6

2. Stanje na dan 31. prosinca 2020. godine 7

3. Plan poslovnih aktivnosti za 2021. godinu 18

3.1. Aktivnosti i ciljevi Društva 2021.-2023. 18

3.2. Izvješća i nadoknada sredstava za financiranje Projekta 20

3.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 21

3.4. Provedba arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji CGO u SDŽ 21

3.5. Preuređenje interijera poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska 21

148 C u Splitu. 21

3.6. Aktivnosti vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta 22

3.7. Upravljanje rizicima 23

4. Plan zapošljavanja 23

5. Financijski dio 24

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je županijska komunalna tvrtka za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: Društvo) osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: SDŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu odnosno jedini član Društva.

Svrha osnivanja Društva definirana je u članku 1. u vezi s člankom 5. Izjave o osnivanju Društva gdje se određuje da se Društvo osniva u svrhu gospodarenja otpadom na području SDŽ.

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva je privremena upraviteljica mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić, predložena Prijedlogom župana Splitsko-dalmatinske županije u svojstvu člana Društva od dana 27. ožujka 2018. godine (Klasa: 080-01/18-03/87, Urbroj: 2181/1-02-18-1), imenovana Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od dana 29. ožujka 2018. godine (Broj: 14. R1-34/2018.) a koja je promjena upisana u sudski registar po službenoj dužnosti Rješenjem Trgovačkog suda od dana 03. travnja 2018. godine (Tt-18/3375-2). Izjava privremene upraviteljice o prihvaćanju postavljenja potpisana je dana 05. travnja 2018. godine pristupom imenovane kod javnog bilježnika (OU-41/18-1).

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Izjavom o osnivanju Društva (potpuni tekst od dana 12. veljače 2018. godine), *Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Društva* (Ur.br. 65/2018 od dana 27. ožujka 2018. godine) i *Poslovnikom o radu Uprave Društva* (Ur.br. 119/15-1 od dana 17. lipnja 2015. godine), uređen je način rada, odlučivanja i druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19).

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20).

Društvo je uspostavljeno s ciljem obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, za što je potrebno izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom, Centar za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica (CGO, PS), što je u skladu sa člankom 84.a st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) u kojem se navodi da djelatnost i poslove vezane za CGO obavlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i/ili jedinice lokalne samouprave. Priprema projekta i izgradnja CGO za obradu ne više od 110.000 t miješanog komunalnog otpada godišnje dodatno je navedena i u Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022., Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

1.1. Opis djelatnosti

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ zakonsku osnovu nalazi u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. (NN 3/2017).

Slika 1: Prikaz kružnog gospodarstva s pregledom nadležnosti u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno sa šest pretovarnih stanica (Projekt) predstavlja važan dio toga sustava koji se mora uspostaviti na županijskoj razini, a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na razini RH.

CGO je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 83. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, u ovom slučaju u CGO.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Projekt obuhvaća ulaganje u izgradnju CGO na lokaciji Kladnjice u Općini Lećevica, izgradnju pretovarnih stanica na šest lokacija koje se nalaze u Splitu, Sinju, Zagvozdu, otoku Braču, otoku Hvaru i otoku Visu te nabavku neophodne opreme za rad istih.

Razvoj Projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji podijeljen je u tri faze:

- Pripremna faza: priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih rješenja, lokacijskih dozvola, a sve u svrhu osiguranja sredstava za sufinanciranje Projekta Centra za gospodarenje otpadom sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Provedbena faza: izrada natječajne dokumentacije, provedba postupaka javne nabave, ugovaranje, izvršavanje ugovora sklopljenih po provedenim postupcima, informiranje i edukacija stanovništva SDŽ o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
- Operativna faza: upravljanje izgrađenom infrastrukturom nakon preuzimanja Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica.

1.2. Osnovni podaci o Projektu

Na osnovi Studije izvedivosti[1], kao temeljnom dokumentu za donošenje Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) o financiranju za projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ od dana 31.12.2018. godine (KLASA: 351-04/18-12/62, URBROJ: 517-09-1-2-1-18-8) i sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.10.0001) dana 25.01.2019. godine, između MZOE kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) kao Posredničkog tijela razine 2 i Društva/Korisnika, utvrđeno je kako slijedi:

Ukupna vrijednost Projekta se određuje u iznosu od **611.419.690,00 kuna (bez PDV-a).**
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose **454.129.208,00 kuna (bez PDV-a).**

[1] Brodarski institut d.o.o, Zagreb, Enviroplan S.A., Atena, Grčka, Procurator Vastitatis d.o.o., Zagreb, 2018.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

1.3. Izvori financiranja Projekta

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje u tekstu: OPKK), Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Na osnovi Odluke MZOE o financiranju za projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ od dana 31.12.2018. godine, u svrhu provedbe Projekta dana 25.01.2019. godine je potpisan:

- **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.** (Referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.10.0001)

između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) i Društva kao Korisnika, **u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji,** a kojim su Društvu/Korisniku dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 322.498.130,90 kuna (bez PDV-a) a koje učešće čini 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova projekta koji iznose 454.129.208,00 kuna (bez PDV-a), ukupne investicije procijenjene na iznos od 611.419.690,00 kuna (bez PDV-a).

Nadalje, na osnovi Odluke Upravnog odbora **Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost** (Fond) od dana 12.03.2020. godine i Odluke Vlade RH od dana 14.05.2020. godine na 230. sjednici Društvu su odobrena sredstva kapitalne pomoći Fonda za sufinanciranje EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, te je Društvo kao Korisnik dana 24.06.2020. godine s Fondom sklopilo:

- **Ugovor reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“**

Time su Društvu/Korisniku dodijeljena sredstava kapitalne pomoći Fonda (bespovratna sredstva) u iznosu od 86.218.156,28 kuna (bez PDV-a) a koje učešće čini 18,9853801 % Fondu prihvatljivih troškova projekta koji iznose 454.129.208,00 kuna (bez PDV-a), ukupne investicije procijenjene na iznos od 611.419.690,00 kuna (bez PDV-a).

Preostalih 10,0000000% sredstava ukupno prihvatljivih troškova Projekta u iznosu od **45.412.920,80 kuna** za realizaciju Projekta osigurala je:

- **Splitsko-dalmatinska županija** Proračunom za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 134/20).

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

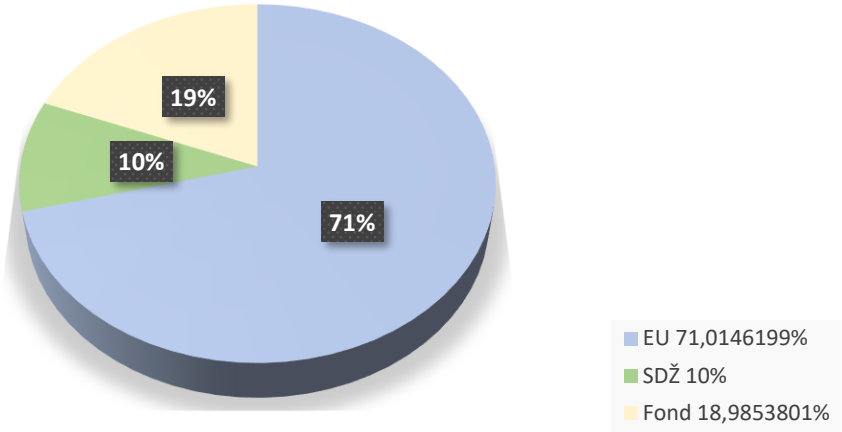

Slika 2: Pregled udjela sufinanciranja prihvatljivih troškova Projekta

Po sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001), Društvo je, kao javno trgovačko društvo i kao Krajnji korisnik sredstava EU Fondova[2], u 2019. godini osnovalo **Jedinicu za provedbu projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji"** radi pružanja stručne pomoći Društvu tijekom realizacije sklopljenih ugovora s isporučiteljima opreme, izvršiteljima usluga i izvođačima radova do roka završetka Ugovora o radovima.

Osiguranjem i posljednjeg izvora sredstava sufinanciranja Projekta odnosno sklapanjem Ugovora reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji" između Fonda i Društva/Korisnika, Jedinica je u rujnu 2020. godine nadopunjena članom Fonda za potrebe realizacije odredbi prethodno navedenog Ugovora s Fondom.

2. Stanje na dan 31. prosinca 2020. godine

2020. godina obilježena je fazom provedbe Projekta u smislu izvršavanja ugovora sklopljenih po provedenim postupcima javnih natječaja, izrade natječajne dokumentacije i provedbe postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao i ulaganja u projektiranje i građenje infrastrukture do lokacija CGO-a i nekih pretovarnih stanica.

Provedba sklopljenih ugovora – u tijeku

Tijekom 2020. godine izvršavani su ugovori sklopljeni u 2019. godini čija se provedba financira u okviru Projekta i to za:

[2]Sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 - Ispravak)

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- ✓ **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ** (Ugovor od 22.02.2019. godine); odabrani izvršitelj predmetne usluge je MEDIA VAL d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 1.261.664,04 HRK bez PDV-a, odnosno 1.577.080,05 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.

- ✓ **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ** (Ugovor od 29.05.2019. godine); odabrani izvršitelj Zajednica ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb; INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb i INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 10.077.050,00 HRK bez PDV-a, odnosno 12.596.312,50 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 57 mjeseci plus 28 dana za izdavanje potvrde Izvođaču o uredno izvršenom Ugovoru. **Napomena:** Pružanje usluga na temelju sklopljenog Ugovora je u mirovanju za vrijeme provedbe postupka javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, s obzirom da početak izvršavanja usluga stručnog nadzora prati ugovor o radovima.

- ✓ **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ** (Ugovor od 29.07.2019. godine); odabrani izvršitelj Zajednica ponuditelja: MERITUM INŽENJERING d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split; EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, 10 000 Zagreb i IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 3.766.997,60 HRK bez PDV-a, odnosno 4.708.747,00 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 61 mjesec plus 28 dana za izdavanje potvrde Izvršitelju usluge o uredno izvršenom Ugovoru

te ugovora koji se financira isključivo sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

- ✓ **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ** (Ugovor od 04.07.2019. godine); odabrani ponuditelj GEOPROJEKT, d.d., Sukoišanska 43, 21 000 Split na iznos od 639.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno 798.750,00 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 42 mjeseca.

Izvršenje predviđenih aktivnosti po navedenim ugovorima obavlja se u skladu s Projektnim zadacima.

Društvo je u 2020. godini provelo postupak jednostavne nabave i ugovorilo Uslugu arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Odabrani Izvršitelj usluge će s izvršenjem usluge započeti po izdavanju Naloga za početak izvršenja usluge od strane Društva kao Naručitelja.

Društvo je u 2020. godini zakupilo poslovni prostor u Splitu, na adresi Vukovarska 148 C, provelo postupak jednostavne nabave i ugovorilo Radove na preuređenju interijera poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska 148 C u Splitu. Odabirom Izvođača radova, isti su uvedeni u posao, te su radovi preuređenja na predmetnoj lokaciji u tijeku.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Provedba otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – u tijeku:

- **Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji**

Slika 3: 3-D prikaz budućeg Centra za gospodarenje otpadom (simulacija na osnovi Idejnog projekta, Geoprojekt d.d., 2017.)

Procijenjena vrijednost ove javne nabave velike vrijednosti iznosi 330.143.215,00 HRK bez PDV-a, odnosno 412.679.019,00 HRK s PDV-om.
Po provedenim prethodnim savjetovanjima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (rujan – prosinac 2019.) i obavljenoj *ex-ante* kontroli Dokumentacije o nabavi od strane PT2 (Fonda) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) od 28.01.2020. godine, postupak javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ pokrenut je objavom poziva u Elektroničkom oglasniku javne nabave 03.02.2020. godine i prvotno planirano otvaranje ponuda je bilo zakazano za 01.04.2020. godine.
11.03.2020. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01).

Pregled tijeka postupka javne nabave:

- 13.02.2020. godine zaprimljena žalba žalitelja na Dokumentaciju o nabavi,
- 17.02.2020. godine zaprimljena žalba žalitelja na Dokumentaciju o nabavi,
- 26.03.2020. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela Rješenje o odbijanju obje žalbe izjavljene na Dokumentaciju o nabavi,
- 28.03.2020. godine Društvo/Naručitelj objavio nastavak postupka javne nabave s rokom za dostavu ponuda 18.05.2020. godine,
- 24.04.2020. godine zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev za produljenje roka za dostavu ponuda do 10.07.2020. godine iz razloga proglašenja epidemije bolesti COVID-19,
- 24.04.2020. godine Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta I objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 01.06.2020. godine,

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- 07.05.2020. godine zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev da se odgodi predviđeni rok predaje ponuda s 01.06.2020. godine za dodatnih 45 dana obzirom na pandemiju bolesti COVID-19,
- 08.05.2020. godine Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta I objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 19.06.2020. godine
- 26.05.2020. godine zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev za produljenje predviđenog roka predaje ponuda 19.06.2020. godine za dodatnih 60 dana,
- 01.06.2020. godine zaprimljena žalba žalitelja na izmjenu Dokumentacije o nabavi,
- 20.07.2020. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela Rješenje o osnovanosti žalbe na dokumentaciju o nabavi sa zahtjevom da se izmijeni dio Dokumentacije o nabavi,
- 18.08.2020. godine Naručitelj objavio nastavak postupka javne nabave s rokom za dostavu ponuda na dan 02.10.2020. godine,
- 14.09.2020. godine Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 16.10.2020. godine
- 24.09.2020. godine zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev da se odgodi predviđeni rok predaje ponuda na dan 16.10.2020. godine za dodatna 3 tjedna obzirom na pandemiju bolesti COVID-19,
- 02.10.2020. godine Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta i objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 30.10.2020. godine,
- 21.10.2020. godine zainteresirani gospodarski subject dostavio zahtjev da se odgodi predviđeni rok predaje ponuda na dan 30.10.2020. godine za dodatnih 30 dana obzirom na pandemiju bolesti COVID-19,
- 22.10.2020. godine zainteresirani gospodarski subject dostavio zahtjeve da se odgodi predviđeni rok predaje ponuda na dan 30.10.2020. godine za dodatnih najmanje 1 mjesec obzirom na pandemiju bolesti COVID-19,
- 24.10.2020. godine Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 05.11.2020. godine
- 28.10.2020. godine zaprimljena žalba žalitelja na izmjenu Dokumentacije o nabavi,
- 20.11.2020. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela Rješenje o odbijanju žalbe izjavljene na Dokumentaciju o nabavi,
- 23.11.2020. godine Društvo/Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 07.12.2020. godine.

Iz ovog pregleda tijeka postupka je razvidno da su zainteresirani gospodarski subjekti ulagali neopravdane žalbe te da su u više navrata zatražili produljenje roka za dostavu ponuda opravdavajući zahtjeve ograničenjima u pripremi ponuda koja je nametnula pandemija, a kojima je Društvo moralo udovoljiti, iako ne u razmjerima koji su bili traženi.
Tako je Društvo, zbog svih gore navedenih razloga, od planiranog datuma otvaranja ponuda **01.04.2020.** pomicalo rok za dostavu ponuda s 01.04.2020. na **18.05.2020., 01.06.2020., 19.06.2020., 02.10.2020., 16.10.2020., 30.10.2020., 05.11.2020. te 07.12.2020.**

Nakon posljednjeg Rješenja DKOM-a kojim je odbijena žalba izjavljena u listopadu 2020. godine, dana **07.12.2020.** godine s početkom u 09:00 sati **održano je javno otvaranje ponuda** u Sveučilišnoj

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

knjižnici Split (Vijećnica Don Frane Bulića, Ruđera Boškovića 31/V u Splitu), u skladu s epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te su do naznačenog vremena zaprimljene četiri ponude.

Slika 4: Održano javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za „Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji", u Sveučilišnoj knjižnici Split, Vijećnica Don Frane Bulića, Ruđera Boškovića 31/ V u Splitu od 07. prosinca 2020. godine, u skladu s epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Postupak pregleda i ocjene ponuda teče u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Rad na izradi dokumentacije o nabavi za predmete nabave – u pripremi:

- Stručni nadzor građenja PS i
- Građenje PS.

Dovršetak izrade navedene dokumentacije uvjetovano je ishođenjem građevinskih dozvola za PS.

Podnošenje Izvješća Posredničkom tijelu 2 i nadoknada sredstava za financiranje Projekta

Društvo je u 2020. godini podnosilo Zahtjeve za nadoknadom sredstava s pripadajućim izvješćima o napretku provedbe Projekta, te su nadoknađena sva tražena sredstva iz izvora OPKK i Fonda u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava po plaćenim i opravdanim računima.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Provedba administrativnih i pravnih procedura

Lokacija Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama

Zemljište u privatnom vlasništvu:

Za otkup zemljišta u privatnom vlasništvu (oko 10 ha) osigurana su sredstva u okviru odobrenog projekta u iznosu od 4.965.331,00 kuna (prihvatljivi troškovi Projekta).

Na zahtjev Društva, Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za imovinsko-pravne odnose pokrenuo je postupak osiguranja dokaza u K.O. Kladnjice o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje.

Zemljište u vlasništvu SDŽ:

Temeljem Ugovora o darovanju nekretnina sklopljenog između RH-Ministarstva državne imovine i Splitsko-dalmatinske županije u svrhu izgradnje CGO u SDŽ (KLASA: 940-01/17-03/4230, URBROJ: 536-03-02-04/09-18-32, veljača 2019.), u postupku je prijenos vlasništva zemljišta sa RH (oko 15 ha) u vlasništvo SDŽ odnosno uknjižba prava vlasništva SDŽ na darovanim nekretninama u zemljišne knjige, nakon čega će uslijediti prijenos vlasništva na Društvo.

Zemljište u vlasništvu Općine Lećevica:

Splitsko-dalmatinska županija je od Općine Lećevica u prosincu 2019. godine zatražila da joj Općina Lećevica darovanjem omogući stjecanje prava vlasništva na zemljištu označenom čest. zem. 2692 i 2693 k.o. Kladnjice, a koje zemljište je u vlasništvu Općine Lećevica, i to u svrhu izgradnje CGO u SDŽ (KLASA: 940-01/19-01/252, URBROJ: 2181/1-02-19-1/252). Supotpisnik zahtjeva je Društvo (Ur.br. 152-1/2019). Općina Lećevica još uvijek nije udovoljila zahtjevu Županije.

Po prijenosu vlasništva zemljišta s Općine Lećevica u vlasništvo SDŽ, uslijedit će prijenos vlasništva zemljišta na Društvo, kao i u slučaju zemljišta darovanog od strane RH.

Lokacije pretovarnih stanica

Za pretovarne stanice Split, Sinj, Zagvozd i Brač su sklopljeni ugovori o pravu građenja.

Tijekom 2020. godine rješavali su se imovinsko-pravni odnosi na lokacijama PS u Starom Gradu na Hvaru i PS u Gradu Visu, a koje dugogodišnje rješavanje je u nadležnosti tijela javne vlasti.

Imovinsko-pravno stanje na PS Hvar:

Po okončanju pojedinačnog ispravnog postupka u srpnju 2020. (započet u 2017. godini) u zemljišne knjige na k.č. 2553/2 upisana je RH kao 1/1 vlasnik, a očekuje se rješavanje uknjižbe vlasništva Grada Starog Grada na dio k.č. 10501, K.O. Stari Grad, koja se u zemljišnim knjigama vodi kao Opća narodna imovina-mjesni narodni odbor, Stari Grad, nakon čega će se konačno regulirati pitanje pravnog interesa za građenje PS.

Postupci su u tijeku i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji sa Starim Gradom i RH.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Imovinsko-pravno stanje na PS Vis:

Rješavanje imovinsko-pravnog pitanja je u sklopu rješavanja istog pitanja na lokaciji odlagališta Welington. Po okončanju postupka u rujnu 2020. godine kojega je vodilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, očekuje se uknjižba vlasništva na Grad Vis na predmetnom zemljištu. Postupci su u tijeku i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji s Gradom Visom.

Glavni projekti pretovarnih stanica i ishođenje građevinskih dozvola

Izrađeni su Glavni projekti pretovarnih stanica Sinj, Brač i Zagvozd s razrađenim tehničko-tehnološkim rješenjima te su na temelju izrađenih Glavnih projekata za pretovarne stanice Sinj, Brač i Zagvozd provedeni postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođena Rješenja za Pretovarnu stanicu Brač i za Pretovarnu stanicu Sinj, dok je postupak za Pretovarnu stanicu Zagvozd u tijeku.

Izrada Glavnog projekta za PS Split i PS Hvar je u tijeku, za PS Vis izrada će biti usklađena s rješavanjem svih pitanja lokacije.

Slika 5: 3-D prikaz sadržaja buduće pretovarne stanice Sinj (simulacija na osnovi Glavnog projekta Pretovarne stanice Sinj, Geoprojekt d.d., 2020.)

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Infrastrukturni radovi do lokacija CGO i PS

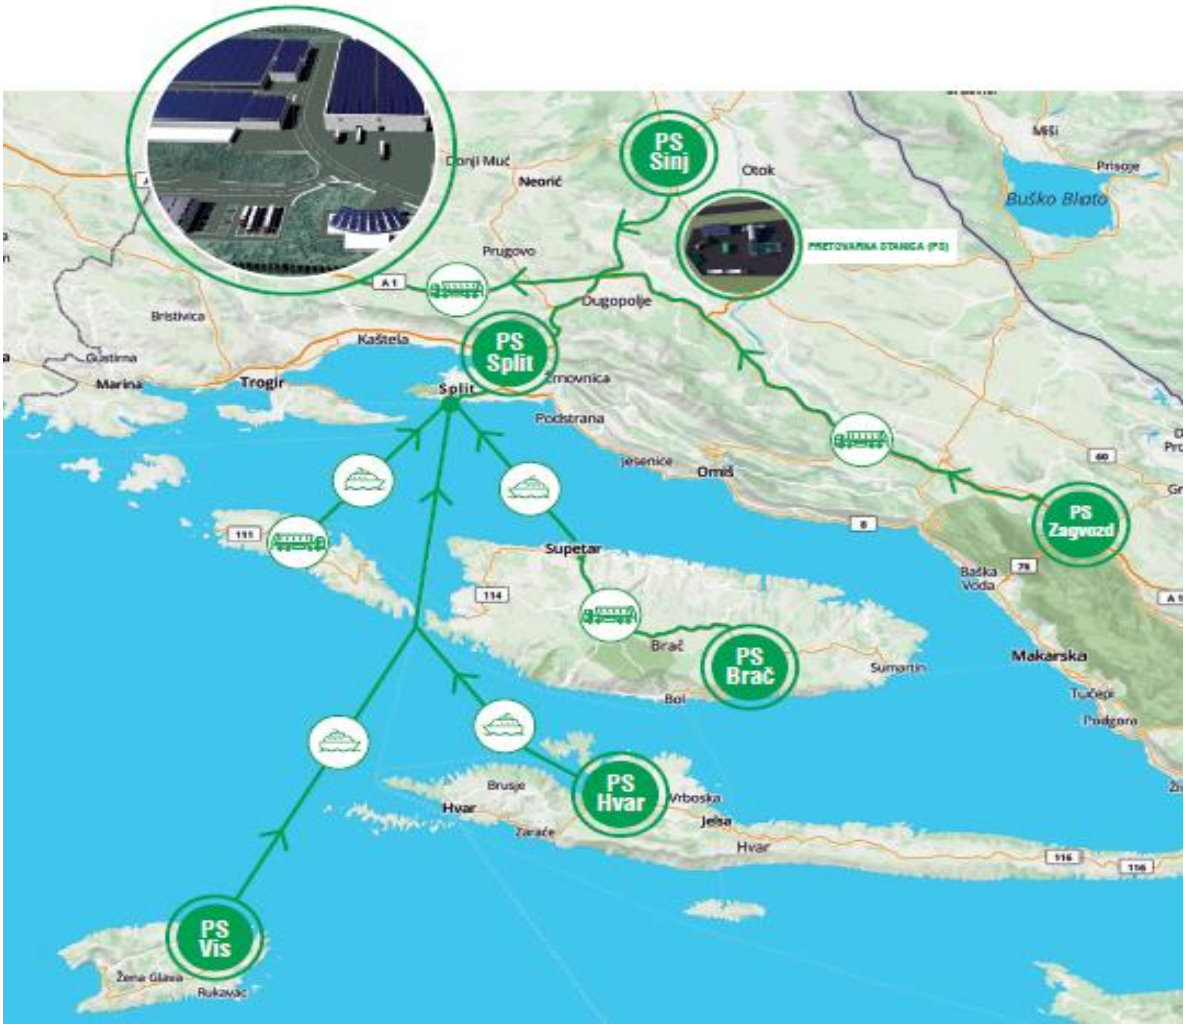

Slika 6: Prikaz lokacija i povezanosti pretovarnih stanica s Centrom za gospodarenje otpadom

Društvo je kontinuirano pratilo pripremu izrade dokumentacije i ishođenja dozvola u koordinaciji s dionicima projekta (HEP, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Županijska uprava za ceste, Hrvatski Telekom, jedinice lokalne samouprave) za izgradnju infrastrukture do svake od 7 lokacija Projekta.

Izdvajaju se sljedeće aktivnosti po pitanju infrastrukture (cesta, struja, voda), tablični prikaz-Tablica 1 – Komunalna infrastruktura A) CGO i B) PS:

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Tablica 1. Komunalna infrastruktura A) CGO i B) PS

A) CGO:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA LOKACIJI CGO (cesta, struja, voda)	STATUS
CGO u SDŽ	INFRASTRUKTURA DO lokacije
Za dionicu Lećevica-Kladnjice izrađena je preklopna karta – utvrđena je jedna trasa za cestu, struju, vodu i telekomunikacije sa svrhom smanjenja troškova	
Građevinske dozvole za 1., 2. i 3. dionicu Ž 6098 i 6115 za Rekonstrukciju i djelomično izmještanje cesta Građevinska dozvola za 3. dionicu Ž 6098 i 6115 obuhvaća elektroenergetski priključak na CGO i priključak vode na CGO	U izradi glavni projekt za DTK instalacije u sklopu 3. dionice Ž 6098 i 6115, nakon čega će se ishoditi građevinska dozvola
Građevinska dozvola za rekonstrukciju raskrižja Ž6098 i nerazvrstane ceste za cestu Privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju raskrižja nerazvrstane ceste za CGO i županijske ceste Ž6098 (2020.)	Izgrađen prometni priključak od županijske ceste do lokacije CGO, te je u 2020. godini ishođena Privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju raskrižja nerazvrstane ceste za CGO i županijske ceste Ž6098
Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu HEP ODS (2019.)	
Građevinska dozvola za izgradnju Trafostanice Lećevica	Radovi na izgradnji započeli i obustavljeni zbog rješavanja odnosa sa Hrvatskim šumama
Građevinska dozvola za elektroenergetski kabel KB 35 Kv Uble do trafostanice u Općini Lećevica	U pripremi je postupak javne nabave za izgradnju
Građevinska dozvola za Dionicu 0 - kroz zaseok Taraši i Dionicu IV - kroz zaseok Barani	Proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, u srpnju 2020. godine izvođač je uveden u posao i građenje je započelo, a istovremeno se rješavaju imovinsko-pravni odnosi na dijelu zahvata
Lokacijska dozvola za Dionicu V - Objekti vodoopskrbe za CGO	Pokrenut postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na česticama u privatnom vlasništvu, očekuje se ishođenje građevinske dozvole. U 2021. godini očekuje se pokretanje postupaka javne nabave za gradnju
Priključak na telekomunikacijsku mrežu će se izvesti prema suglasnosti nadležnog operatera, osigurano je financiranje izgradnje TK instalacija od Kladnjica do CGO od strane ŽUC-a, dok je Društvo preuzelo izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola	

B) PRETOVARNE STANICE

POPIS IZRAĐENE DOKUMENTACIJE ZA PRETOVARNE STANICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI	STATUS
PS SPLIT	INFRASTRUKTURA DO PS
Idejni projekt Pretovarne stanice Split (2015.)	Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola za pristupnu
Geodetski projekt Pretovarne stanice Split na k.č. 83/2 K.O. Kamen (2015.)	

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica „Karepovac“, Grad Split za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.)	cestu Put Kamena s priključkom do PS Split. Po ovjeri svih parcelacijskih elaborata, pokrenut će se postupak otkupa zemljišta i javne nabave za izgradnju. U studenom 2020. godine potpisan je ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta za cestu Put Kamena.
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)	
Sporazum o ustupanju izgradnje pretovarne stanice u sklopu odlagališta komunalnog otpada Karepovac u Splitu Regionalnom centru čistog okoliša d.o.o. (2016.)	
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Split (2017.) Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Split (2020.)	
Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. i Grada Splita za izgradnju PS Split (2018.)	
Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu K.O. Kamen (2018.)	
Lokacijska dozvola za pristupni put Put Kamena do PS Split (2017.)	
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Split (2016.)	
Rješenje o produženju važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Split (2018.)	
Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu K.O. Kamen (2020.)	
PS SINJ	INFRASTRUKTURA DO PS
Idejni projekt Pretovarne stanice Sinj (2015.)	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu unutar gospodarske zone Kukuzovac do PS Sinj s potrebnom infrastrukturom. U prosincu 2020. godine Županijska skupština SDŽ donijela je odluku o sufinanciranju izgradnje prometnice s infrastrukturom do PS Sinj. Izglasavanjem Proračuna Gradskog vijeća Grada Sinja, očekuje se pokretanje postupka javne nabave za gradnju.
Geodetski projekt Pretovarne stanice Sinj na k.č. 1718/6 K.O. Brnaze (2015.)	
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica „Kukuzovac“ Grad Sinj za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.godine)	
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)	
Lokacijska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom – PS SINJ, 3. skupine, (2016.)	
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Sinj (2018.)	
Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu K.O. Brnaze (2016.)	
Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. i Grada Sinja za izgradnju PS (2016.)	
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Sinj (2015.)	
Rješenje o produženju važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Sinj (2018.)	
Rješenje o upisu prava građenja PS Sinj, Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju (2016.)	
Građevinska dozvola prometnice unutar gospodarske zone Kukuzovac	
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Sinj za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2020.godine)	
PS ZAGVOZD	INFRASTRUKTURA DO PS
Idejni projekt Pretovarne stanice Zagvozd (Geoprojekt d.d., 2015.)	Ishođena građevinska dozvola za pristupnu cestu od D76 do PS Zagvozd. U rujnu 2020. godine je pokrenut postupak javne nabave za izgradnju pristupne ceste, potpisan je ugovor s Izvođačem radova te se uvođenje u posao predviđa u
Geodetski projekt Pretovarne stanice Zagvozd na k.č. 9274/113 K.O. Zagvozd (2016.)	
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica „Zagvozd“ Općina Zagvozd za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.)	
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)	
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Zagvozd (2016.) Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Zagvozd (2018.)	

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu za K.O. Zagvozd (2016.)	siječnju 2021. godine.
Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. i Općine Zagvozd za izgradnju PS (2016.)	
Rješenje o upisu prava građenja PS Zagvozd – polog u sudske isprave, Zemljišno-knjižni odjel Imotski (2016.)	
Građevinska dozvola prometnog priključka na državnu cestu od PS Zagvozd (2020.) (pokrenut postupak JN)	
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Zagvozd za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2020.)	
PS VIS	INFRASTRUKTURA DO PS
Idejni projekt Pretovarne stanice Vis (2015.)	Izgradnja PS Vis predviđena je u sklopu Sanacije odlagališta Wellington. Kazneni postupak po kaznenoj prijavi Grada Visa protiv nepoznatog počinitelja je dovršen. DORH izdao rješenje o vlasništvu Grada Visa nad zemljištem. Uknjižba vlasništva na Grad Vis još nije izvršena. Potrebno je uskladiti cjelovito projektno rješenje Sanacije odlagališta Wellington sa stanjem na terenu. Problem predstavlja neusklađenost katastra i zemljišnika.
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Vis, Grad Vis za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.)	
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)	
Sporazum o ustupanju izgradnje Faze V. sanacije odlagališta neopasnog otpada Wellington – Izgradnja PS Vis - Regionalnom centru čistog okoliša d.o.o. (2016.)	
Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za PS Vis (2016.)	
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Vis (2016.)	
Rješenje o produženju važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Vis (2018.)	
PS BRAČ – OPĆINA PUČIŠĆA	INFRASTRUKTURA DO PS
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Brač, Općina Pučišća za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.)	Ishođena pravomoćna građevinska dozvola pristupne ceste od D113 do PS Brač. Osigurani izvor financiranja. Gradnja u tijeku. Izgrađen Priključak na D113.
Geodetski projekt Pretovarne stanice Brač na k.č. 4347/2 K.O. Gornji Humac (2015.)	
Idejni projekt Pretovarne stanice Brač (2015.)	
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)	
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Brač (2016.) Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Brač (2018.)	
Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. i Općine Pučišća (2018.g)	
Građevinska dozvola za pristupnu cestu do PS Brač od državne prometnice (2016.) (u izgradnji)	
Građevinska dozvola za priključak na državnu prometnicu od PS Brač (2016.) (izgrađeno)	
Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu K.O. Gornji Humac (2018.)	
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Brač za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2020.)	
PS HVAR – STARI GRAD	INFRASTRUKTURA DO PS
Idejni projekt Pretovarne stanice Stari Grad na Hvaru (2018.)	Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola za priključak pretovarne stanice na županijsku cestu ŽC6252, dokaz pravnog interesa i sporazum o
Lokacijska dozvola prometnog priključka PS Stari Grad na Hvaru (2020.)	
Geodetski projekt Pretovarne stanice Hvar na k.č. 2621/4 K.O. Stari Grad (2015.)	
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Stari Grad na Hvaru za	

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.)	preuzimanju investicije od ŽUC-a. Čeka se ovjera parcelacijskog elaborata zbog neusklađenosti u katastru koji mora izvršiti ispravke.
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)	

Do danas je izrađeno ukupno 27 idejnih i glavnih projekata i ishođene su 23 lokacijske i građevinske dozvole za infrastrukturu, osiguravaju se izvori financiranja, postupci javne nabave su ili u tijeku ili su provedeni te su sklopljeni i u realizaciji ugovori o građenju.

3. Plan poslovnih aktivnosti za 2021. godinu

3.1. Aktivnosti i ciljevi Društva 2021.-2023.

Slika 7: Simulacija prikaza obuhvata Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u Klanjicama

Najistaknutije planirane aktivnosti u 2021. godini usmjerene su na dovršetak postupka javne nabave i ugovaranje s odabranim ponuditeljem za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, provedbu novih postupaka javne nabave kako bi se izgradnja i opremanje CGO-a i PS odvijalo usklađeno tijekom sljedećeg razdoblja, te na izvršavanje svih sklopljenih ugovora o javnoj nabavi kao i okončanje započetih administrativnih i pravnih procedura.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- **Postupak pregleda i ocjene ponuda za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji**

  Otvaranjem pristiglih ponuda utvrđeno je kako su vrijednosti svih pristiglih ponuda bez PDV-a više od procijenjene vrijednosti nabave, koja je još 2015. godine procijenjena na 330.143.215,00 HRK bez PDV-a. Razlog tome pronalazi se u kontinuiranom povećanju cijena građevinskih radova, koja prema nekim procjenama iznosi oko 0,5% na mjesečnoj razini. Ovakva je situacija zabilježena i u drugim postupcima javne nabave (CGO Biljane Donje, CGO Bikarac, CGO Babina gora, projekti iz sektora voda također). Stoga će se u dogovoru s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i u skladu s utvrđenim procedurama osigurati dodatno sufinanciranje od strane Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

  Predviđa se da će pregled i ocjena ponuda trajati oko 60 dana, nakon čega će biti donesena odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u 2021. godini. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem očekuje se u proljeće 2021. godine.

  Projektiranje i građenje CGO će se ugovoriti prema FIDIC tipu ugovora - Općim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke, strojarske, građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača - tzv. izdanje nove Žute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine. To znači da će **ugovoreni izvođač najprije izraditi Glavni projekt, ishoditi građevinske dozvole, izgraditi Centar za gospodarenje otpadom te provesti Pokusni rad prije preuzimanja.** Nakon preuzimanja slijedi Razdoblje obavještavanja o nedostacima u trajanju od dvije godine.

- **Provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi**

  U 2021. godini se nastavlja provedba prethodno sklopljenih ugovora:

  - **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ,**
  - **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ (početak pružanja usluga ovisi o početku Ugovora o radovima),**
  - **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ,**
  - **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ,**
  - **Usluga arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji**
  - **Radovi na preuređenju interijera poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska 148 C u Splitu.**

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- **Ishođenje građevinskih dozvola za PS**

- **Izrada dokumentacije o nabavi i provedba postupaka javne nabave**
  Dokumentacija o nabavi za sljedeće predmete nabave je u postupku izrade u suradnji s konzultantima temeljem Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja Projektom, i to za:

  - **Građenje PS**
  - **Stručni nadzor građenja PS**
  - **Pokretna oprema za CGO**
  - **Pokretna oprema za PS.**

3.2. Izvješća i nadoknada sredstava za financiranje Projekta

Sukladno odredbama **Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001)** – (**Prilog II Ugovora - Opći uvjeti** koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.), Društvo/Korisnik je obvezno tijekom izvršavanja Ugovora podnositi PT-u2 sljedeća izvješća: izvješća o napretku, završno izvješće o provedbi Projekta te izvješće nakon provedbe Projekta, te ista dostavljati na obrascu Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Predmetna izvješća se odnose na ugovoreni Projekt u cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadržajno moraju zadovoljavati sve ugovorene uvjete, sukladno članku 14. stavku 14.1. Priloga II Općih uvjeta Ugovora.

Plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava Projekta, Društvo/Korisnik potražuje podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava PT-u2 kroz sustav „eFondovi“. Zahtjevi za nadoknadom sredstava moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom o nastalim i potraživanim prihvatljivim troškovima Projekta, a sve sukladno članku 15. stavku 15.6. Priloga II Općih uvjeta Ugovora.
Dijelove neprihvatljivih projektnih troškova snose SDŽ i Fond (u manjem dijelu), obzirom na članak 6. stavak 6.3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) kojim je određeno da je Društvo/Korisnik obvezno osigurati kontinuirano financiranje Projekta te snositi sve Projektne troškove osim prihvatljivih troškova koji su financirani bespovratnim sredstvima.

Nadalje, Društvo/Korisnik je obvezno osigurati PT-ovima kao i drugim nadležnim tijelima i institucijama provođenje potrebnih provjera na licu mjesta, dostupnost svih dokumenata, podataka i evidencija povezanih s Projektom ili potrebnih za potvrdu ispravnosti Projekta i Projektnih izdataka te osigurati pristup svim prostorijama i mjestima u kojima se provodi Projekt. Takva je provjera na licu mjesta prvi put provedena u 2019. godini od strane PT2.

Društvo dostavlja zahtjeve za nadoknadom sredstava s odgovarajućom dokumentacijom, te pohranjuje svu Projektnu dokumentaciju radi osiguranja revizijskog traga.

Sve prethodno navedeno Društvo planira odnosno u obvezi je obavljati za vrijeme provedbe Projekta, te u razdoblju do pet godina nakon zatvaranja Operativnog programa pod kojim se Projekt sufinancira.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

U 2021. godini bit će izrađena Izvješća i Zahtjevi za nadoknadom sredstava u broju i u visini iznosa u skladu s realizacijom Projekta.

3.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Lokacija Centra za gospodarenje otpadom

U okviru Projekta osigurana su sredstva za otkup zemljišta kao prihvatljivi troškovi Projekta. Uknjižbom vlasništva zemljišta na Društvo nakon otkupa zemljišta od privatnih vlasnika, nakon uknjižbe zemljišta darovanog od strane Republike Hrvatske i Općine Lećevica Splitsko-dalmatinskoj županiji te prijenosa u vlasništvo Društva, formirat će se jedinstvena građevinska čestica. Predviđeni rok je prvi kvartal 2021. godine.

PS Hvar, PS Vis

U 2021. godini očekuje se okončanje upravnih postupaka a koji nisu u nadležnosti Društva, slijedom čega će se ostvariti uvjeti za dokazivanje pravnog interesa za građenje Pretovarne stanice Stari Grad i za Pretovarne stanice Vis, te će Društvo ishoditi građevinske dozvole.

3.4. Provedba arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji CGO u SDŽ

Odabrani Izvršitelj Usluge arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji će s izvršenjem usluge započeti po izdavanju Naloga za početak izvršenja usluge od strane Društva kao Naručitelja, a u skladu s Posebnim Uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela u Trogiru.

3.5. Preuređenje interijera poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska 148 C u Splitu.

Radovi preuređenja interijera zakupljenog poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska 148 C u Splitu su u tijeku. Planirani završetak radova očekuje se u veljači 2021. godine.
Osiguranje navedenog poslovnog prostora proizlazi iz obveze Društva u svojstvu Naručitelja za osiguranjem prikladne sobe za sastanke i odgovarajućeg namještaja za barem dvadeset osoba tijekom cjelokupnog razdoblja provedbe Projekta.
Ovaj poslovni prostor koristit će se i za ostale potrebe Društva.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

3.6. Aktivnosti vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta

Jedan od ugovora u okviru provedbe Projekta je Ugovor o uslugama vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ.

Glavni cilj ovog Ugovora jest osiguranje pravilnog daljnjeg predstavljanja Projekta i njegove vidljivosti u javnosti kao važnog infrastrukturnog projekta čija se izgradnja sufinancira sredstvima Europske unije te jačanje stručnih kapaciteta Društva za učinkovit odnos s javnošću tijekom izgradnje Projekta koji će se kasnije pretvoriti u odnos s korisnicima usluga izgrađene infrastrukture za gospodarenje otpadom.

Posebni ciljevi Ugovora su:

- ✓ osigurati kvalitetno predstavljanje i vidljivost Projekta različitim skupinama javnosti,
- ✓ pomoći Društvu u predstavljanju uloge Projekta u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (CSGO) koji se uvodi u SDŽ,
- ✓ podizati javnu svijest o koristima Projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima,
- ✓ povećati razumijevanje uloge Društva u CSGO u SDŽ,
- ✓ motivirati stanovnike SDŽ za aktivnim sudjelovanjem u razvoju novog CSGO, te
- ✓ unaprijediti znanje i vještinu zaposlenika Društva za stvaranje i provedbu dugoročne kvalitetne strategije odnosa s javnošću u uspostavi i razvoju CSGO, promociji kružne ekonomije, zaštite okoliša, zdravlja ljudi.

Osiguranjem podrške za odnose s javnošću kroz 2021. godinu planiraju se sljedeće aktivnosti:

- Provođenje redovitih mjesečnih sastanaka s Društvom/Naručiteljem, dostava dvotjednih pregleda izvršenih aktivnosti
- Stručna podrška i savjetovanje Naručitelja u kriznim situacijama
- Stručna podrška u upravljanju odnosima s medijima
- Izrada, priprema govora i prezentacija tijekom trajanja Projekta
- Oblikovanje, izrada i dostava promotivnih materijala – Dizajn, grafička priprema i tisak promotivnih materijala
- Plan izrade i izrada multimedijskih sadržaja
- Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti projekta
- Edukativna događanja
- Konferencije za medije
- Mjesečno praćenje medija.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

3.7. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima redovita je aktivnost Društva čime se omogućuje kontinuirano razmatranje izloženosti Projekta rizicima i postavljanje prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja uspješnosti poslovnih ciljeva.

Društvo će i u 2021. godini nastaviti s procesom upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i apsorpciju financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 2021. godini.

Također, vrlo je važno napomenuti da su se, osiguranjem podrške za odnose s javnošću, informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta, uključile i aktivnosti koje se odnose na izradu Analize situacije i rizika koji se mogu pojaviti tijekom provedbe Projekta koja uključuje fazu javnog nadmetanja, projektiranje i ishođenje dozvola i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i 6 pretovarnih stanica.

Kroz 2020. godinu, a nakon kvalitetno provedene edukacije, trajao je planirani proces implementacije ERP-a (Enterprise Resource Planning System) odnosno integriranog poslovnog informacijskog sustava koji podržava odvijanje mnogih operativnih procesa poduzeća u poslovnim područjima za financije i računovodstvo. Sklopljenim ugovorom sa gospodarskim subjektom odabran je ERP Pantheon, čije specifikacije odgovaraju sadašnjim i budućim potrebama Društva, a koji će moći integrirano upravljati bazom podataka, dobro strukturirati procese i automatizirati obradu raznih podataka čija upotreba donosi razne benefite.
Kroz 2021. godinu očekuje se implementacija rješenja za nabavu, a kroz 2022. godinu za skladištenje, proizvodnju, prodaju i druga poslovna područja s primjenom prije početka Pokusnog rada CGO.

Nadalje, temeljem sklopljenog Ugovora sa gospodarskim subjektom o pružanju usluge izrade, implementacije i održavanja IT sustava za upravljanje projektima i procesima uredskog poslovanja, Društvo je sudjelovalo na edukacijama korištenja poslovnog sustava aplikacija FMS, DMS, PROJEKTI - aplikacija za upravljanje projektom.

4. Plan zapošljavanja

Za pravilno upravljanje provedbom Projekta, potrebno je raspolagati adekvatnim stručnim kapacitetima. Društvo je obvezno ostvariti učinkovitu i pravovremenu provedbu Projekta i korištenje sredstava OPKK, te jačati vlastite organizacijske i stručne kapacitete za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom.

Razvoj odnosno plan zapošljavanja u Društvo usko je vezan uz razvoj Projekta te je kao takav predviđen i planiran Studijom izvedivosti za projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Studija izvedivosti je glavni dokument kojim se zahtijeva interdisciplinaran pristup kad je riječ o strategiji zapošljavanja. Ista predviđa zapošljavanje kadrova određene stručnosti i dodatno osposobljavanje po svakoj fazi Projekta.

Obzirom da je Društvo kao krajnji korisnik sredstava EU Fondova isključivo odgovorno za razvoj i implementaciju sustava po fazama (pripremna, provedbena i operativna faza), nužno je da u Društvu budu zaposleni kadrovi određene stručnosti. Plan zapošljavanja u Društvo za 2020. godinu nije realiziran po planu obzirom na situaciju s koronavirusom, stoga se u 2021. godini planiraju provesti postupci zapošljavanja u Društvo, i to sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji Društva i sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u Društvo.

5. Financijski dio

➢ Prihodi i priljevi Društva

Prihodi

Društvo će ostvariti financijske prihode na dane pozajmice Općini Lećevica i prihode od državnih potpora prema HSFI 15 – Prihodi koji će se priznati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se sučelili s odgovarajućim rashodima. Potraživanja za državne potpore za nadoknadu nastalih troškova u godini treba priznati kao prihod razdoblja u kojem je potraživanje nastalo.

Društvo u provedbenoj fazi projekta (razvoj) nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada Društvo Projekt materijalizira, znači, po završetku izgradnje i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije).

Priljevi

Redovno poslovanje Društva se u potpunosti financira sredstvima osnivača, Splitsko-dalmatinske županije kao jedinog vlasnika, obzirom da još ne ostvaruje vlastite prihode, i to na temelju odluka Županijske skupštine SDŽ odnosno uplatama/transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Osnivač pri tome neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvoja Projekta.

Proračunom Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu *(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 134/20, od 30. studenoga 2020. godine),* za Društvo - Projekt su osigurana sredstva za 2021. godinu u iznosu od 88.000.000,00 kuna.

Društvo će ostvarivati priljeve iz EU fondova na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) i FZOEU na temelju Ugovora reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta, a sve prema odobrenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava za prihvatljive troškove Projekta u

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

njihovim udjelima prema metodi nadoknade i metodi plaćanja. Zahtjevi za nadoknadom sredstava predavat će se maksimalno jednom mjesečno ili minimalno jednom kvartalno prema svakom pojedinačnom ugovoru za sufinanciranje Projekta.

➢ Odljevi Društva

Investicije

Društvo je u financijskom dijelu ovoga Plana za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu prikazalo ukupne vrijednosti pojedinih stavki projekta i njihovu planiranu financijsku realizaciju kroz vrijeme (tablica 4).

Projekt zajednički financiraju EU fondovi i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju ranije navedenih zaključenih Ugovora o bespovratnim sredstvima i davanjem sredstava kapitalne pomoći te SDŽ kroz odobreni županijski proračun. Iz navedenih izvora financirat će se nekretnine u pripremi - imovina u obliku tehničko-tehnološke dokumentacije nužne za izvedbu Projekta, zemljište, građenje, pokretna oprema i sva ostala imovina potrebna za budući Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji te pretovarne stanice.

EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Splitsko-dalmatinska županija u 2021. godini financirat će provedbu Projekta u sljedećim iznosima bez PDV-a *(odljevi za investicije):*

- 82.220.000,00 kn osigurat će SDŽ,
- 46.097.620,00 kn osigurat će EU i
- 12.962.953,00 kn osigurat će FZOEU.

Rashodi

100 % sredstava SDŽ u iznosu od 5.780.000,00 kn osigurana su Društvu za redovito poslovanje.

U 2021. godini aktivnosti Društva će se financirati kako slijedi prema *Tablici 2.*

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr
Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Tablica 2. Plan financiranja provedbe Projekta u 2021. godini

PLAN FINANCIRANJA PROVEDBE PROJEKTA U 2021. GODINI				
Aktivnosti	**Izvori financiranja**	**SDŽ** (u kunama)	**EU** (u kunama)	**FOND** (u kunama)
Provedba Projekta Neprihvatljivi troškovi za rashode poslovanja	Sredstva SDŽ	4.792.000		
Provedba Projekta Izrada dokumentacije	Sredstva FZOEU (po Ugovoru s RCČO d.o.o., glavni projekti 6 PS)			639.000
Provedba Projekta Prihvatljivi troškovi	Sukladno osiguranim sredstvima od strane SDŽ, EU i Fonda	45.412.921	46.097.620	12.323.953
Provedba Projekta Neprihvatljivi troškovi za investicije	Sukladno osiguranim sredstvima od strane SDŽ	37.795.079		
SVEUKUPNO		**88.000.000**	**46.097.620**	**12.962.953**

U nastavku dajemo tablični prikaz Računskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu *(Tablica 3).*

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Tablica 3: Plan poslovanja Društva za 2021. godinu i procjena za 2022. i 2023. godinu

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU I PROCJENA ZA 2022. I 2023. GODINU SA SUFINANCIRANJEM IZ EU I FZOEU

				2021			2022			2023		
Računski plan za poduzetnike	EU	Opis	Procijenjena vrijednost	SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU
0	EU	Kupnja zemljišta	4.965.331	496.533	942.687	3.526.111						
0	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje	367.026.147	36.702.615	9.758.485	36.501.515		31.325.877	117.174.123		28.596.947	106.966.586
0	EU	CGO - Ugovor o nadzoru radova	11.400.000	1.140.000	730.937	2.734.063		797.386	2.982.614		636.010	2.378.990
0	EU	PS - Ugovor o radovima za 6 PS, građenje	37.548.530	3.754.853	379.708	1.420.292		4.556.491	17.043.509		2.192.532	8.201.145
0	EU	PS - Ugovor o nadzoru radova	760.000	76.000	10.822	40.478		124.354	465.146		9.113	34.087
0	EU	CGO - oprema	22.549.200	2.254.920				4.281.051	16.013.229			
010		Tehničko-tehnološka dokumentacija, projekti, elaborati, prevođenje, usluge, dozvole	330.000	170.000			80.000			80.000		
010		Doprinosi za CGO i 6 PS (građevinske dozvole, uporabna dozvola, komunalni i vodni doprinos)	17.097.000	17.097.000								

010		Projektiranje glavnih projekata 6 pretovarnih stanica i projektiranje glavnog projekta za pristupnu promenticu za PS Zagvozd i projektiranje Hvar	679.000	40.000	639.000							
012		Ulaganje na tuđoj imovini	555.000	515.000			20.000			20.000		
020		Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - troškovi odvjetnika, ugovora, upisa čestica, parcelizacija, javnog bilježnika, poreza i neprihvatljivih troškova	1.490.079	1.490.079								
027		Priključak na vodovodnu i elektoenergetsku mrežu,	6.871.500				6.871.500					
037		Pokretna oprema PS	39.000.000	0			39.000.000					
037		Putničko vozilo i terensko vozilo	250.000	125.000			125.000					
037		Informatička oprema i software	2.984.000	142.000			2.192.000			650.000		
037		Uredska oprema	2.148.000	116.000			1.516.000			516.000		
037		Ugradnja piezometara	4.500.000				4.500.000					
037		Oprema za laboratorij i PS, meteorološka postaja, solari	3.400.000	700.000			2.700.000					
0		Financiranje PDV-a u nabavi, rezerviranje za nabave veće od procjenjene i rezerviranje za umanjeno financiranje projekta	37.900.000	15.400.000			9.000.000			13.500.000		
0		Ostale investicije u CGO i PS	6.000.000	2.000.000			2.000.000			2.000.000		
KLASA 0		**U K U P N O**	**567.453.787**	**82.220.000**	**12.461.639**	**44.222.459**	**68.004.500**	**41.085.160**	**153.678.620**	**16.766.000**	**31.434.602**	**117.580.807**
4	EU	CGO - TA - Tehnička pomoć	8.360.000	836.000	394.121	1.474.206		210.926	788.965		982.131	3.673.651
4	EU	CGO - PR - Odnosi s javnošću	1.520.000	152.000	107.193	400.955		104.097	389.373		77.288	289.094

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

401		Uredski materijal i materijali za čišćenje	236.500	65.000			71.500			100.000		
406		Usluge operativnih troškova pretovarnih stanica, gorivo i struja u fazi testiranja CGO	11.832.000	0			3.944.000			7.888.000		
407		Potrošena energija (struja, gorivo…)	295.800	92.400			101.700			101.700		
410		Troškovi usluga telefona, pošte	115.200	36.000			39.600			39.600		
411		Troškovi vanjskih usluga i ostale usluge	195.200	60.500			66.800			67.900		
412		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zaštite na radu i monitoringa	765.600	49.000			354.300			362.300		
413		Registracija vozila i osiguranje	2.087.600	17.000			1.035.300			1.035.300		
414		Zakupnine i najamnine	887.100	277.200			304.900			305.000		
415		Promo materijali i ostali troškovi PR (sajmovi, edukacije, oglasi,)	227.400	74.200			76.600			76.600		
416		Drugi dohodak	135.550	42.350			46.600			46.600		
416		Konzultantske usluge, savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, prevoditelji	1.152.500	362.600			383.300			406.600		
416		Dokumentacija i troškovi postupka u javnoj nabavi za CGO i PS	300.000	100.000			100.000			100.000		
417		Komunalne usluge i usluge zbrinjavanja produkata obrade za vrijeme pokusnog rada	826.000	6.000			410.000			410.000		
419		Ostali nespomenuti rashodi	550.200	72.100			283.500			194.600		
420		Plaće i doprinosi za redovni rad	25.314.500	2.826.500			9.660.000			12.828.000		
460		Naknade za službeni put, dnevnice, noćenje, prijevoz, cestarine i sl.	724.850	181.150			399.400			144.300		
461		Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte)	2.030.500	72.000			872.000			1.086.500		

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

461		Ostali rashodi za zaposlene	2.649.000	188.000			1.138.000			1.323.000		
462		Naknade NO	360.000	120.000			120.000			120.000		
463		Reprezentacija	144.500	44.000			48.500			52.000		
464		Osiguranje, zaposlenika, imovine	926.000	26.000			450.000			450.000		
465		Bankarske usluge, tečajne razlike	83.000	25.000			28.000			30.000		
469		Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura	182.500	55.000			61.500			66.000		
KLASA 4		**U K U P N O**	**61.901.500**	**5.780.000**	**501.314**	**1.875.161**	**19.995.500**	**315.023**	**1.178.339**	**27.234.000**	**1.059.419**	**3.962.745**
		U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4)	**629.355.287**	**88.000.000**	**12.962.953**	**46.097.620**	**88.000.000**	**41.400.183**	**154.856.959**	**44.000.000**	**32.494.021**	**121.543.552**

KLASA: 11.02.01/001
URBROJ: 01-20-582

Split, 29. prosinca 2020. godine

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101
info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija
Zajedno do fondova EU
EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.
